

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 土坝工程

自评项目单位： 子洲县瓜园则湾乡人民政府

项目主管部门： 子洲县人民政府

项目单位法人代码： 75883265-2

评价工作组负责人： 邱战峰 (签章)

联系人： 张东梅

联系电话： 13571276607

评价时间： 2021 年 12 月 23 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		火石沟新建土坝项目						
主管部门及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府 (161001)			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	100%	10	100%	10
		其中: 财政拨款	40	40	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在西沟村新建土坝一座、坝高 50 米、坝顶宽 15 米。				西沟村新建土坝工程已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建坝数量 (座)	1	1	8	8	
			坝高 (米)	≥50	≥50	8	8	
			坝顶宽 (米)	≥15	≥15	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤40 万	≤40 万	8	8	
	时效指标	完成时限		2021 年 12 月 30 日前	2021 年 12 月 30 日前	8	8	
	效益指标	经济效益指标	坝地每年可产粮价值 (万元)	≥3.2	≥3.2	8	8	
		社会效益指标	受益人口 (户)	≥36	≥36	8	8	
			其中监测对象 (户)	≥2 户	≥2 户	8	8	
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥20 年	≥20 年	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

火石沟新建土坝项目 项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

子洲县瓜园则湾乡人民政府“土坝工程”专项经费属于农村基础实施建设，实拨 40 万元，包括西沟村新建土坝一座、坝高 50 米、坝顶宽 15 米。截止 2021 年 11 月 15 日全部列支。

2. 项目建设内容：

西沟村新建土坝一座、坝高 50 米、坝顶宽 15 米。

（二）项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表						
项目名称		火石沟新建土坝项目				
主管部门						
资金金额		实施期资金总额：	40 万元			
		其中：财政拨款	40 万元			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在西沟村新建土坝一座、坝高 50 米、坝顶宽 15 米。			西沟村新建土坝工程已完成。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	新建坝数量（座）	1	1	
			坝高（米）	≥50	≥50	
			坝顶宽（米）	≥15	≥15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	≤40 万	≤40 万	
	时效指标	完成时限		2021 年 12 月 30 日前	2021 年 12 月 30 日前	
	效益指标	经济效益指标	坝地每年可产粮价值（万元）	≥3.2	≥3.2	
		社会效益指标	受益人口（户）	≥36	≥36	
其中监测对象				≥2 户	≥2 户	

		(户)			
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	

1、总体目标：

解决西沟村村民供电问题，提高居民幸福感

2. 年度目标：

完成西沟村新建土坝一座、坝高 50 米、坝宽 15 米。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

下达资金 40 万元，全部为农村基础实施建设预算资金，全部用于西沟村新建土坝工程问题，截止 2021 年 11 月 15 日全部兑现完毕。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

西沟村新建土坝一座、坝高 50 米、坝宽 15 米，共下达资金 40 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021.10.26	农村基础设施建设	西沟村土坝工程	20
2	2021.11.03	农村基础设施建设	西沟村土坝工程	10
3	2021.11.05	农村基础设施建设	西沟村土坝工程	5
4	2021.11.12	农村基础设施建设	西沟村土坝工程	5
合计				40

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县瓜园则湾乡人民政府土坝工程绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 100 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 48 分，自评得分 48 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 24 分，年度预期与实际完成值一致得 24 分。2. 质量指标，共 8 分，年度预期与实际完成值一致得 8 分。3. 时效指标，共 8 分，年度预期与实际完成值一致得 8 分。4. 成本指标，共 8 分，年度预期与实际完成值一致得 8 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 8 分，自评得分 8 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标：共 16 分，年度预期与实际完成值一致得 16 分；2. 可持续影响指标，共 8 分，年度预期与实际完成值一致得 8 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%）。服务对象满意度为 95%，根据子洲县瓜园则湾乡人民政府问卷调查情况，群众满意度为 95%，按公式计算，得 10 分。以后要继续以群众需求为目标，完成高质量项目。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，保证工程及时、高质量完成。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

无


（二）改进措施

无

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人员	张杰	书记	子洲县瓜园则湾乡人民政府	张杰
	邱战峰	乡长	子洲县瓜园则湾乡人民政府	邱战峰
	张东梅	会计	子洲县瓜园则湾乡人民政府	张东梅

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

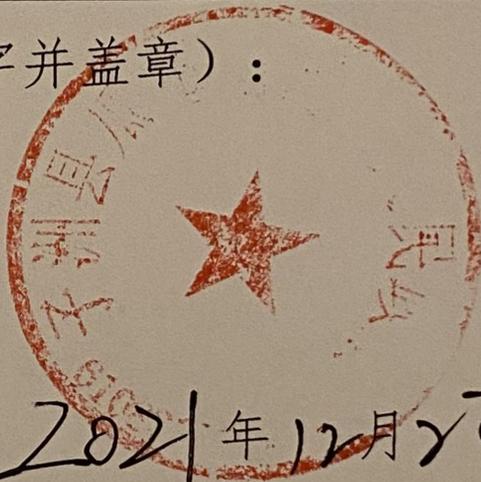

2021年12月23日
