


项目支出绩效自评表  
(2022年度)



项目名称		三川口镇吴山村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府		实施单位	三川口镇吴山村民委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16	16	100%	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固吴山村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。2. 促进产业的发展，对农民素质、生活质量的提高重要作用。			1. 进一步巩固吴山村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。2. 促进产业的发展对农民素质、生活质量的提高重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水泵(个)	3	3	5	5	
			水表(块)	28	28	5	5	
			电线(米)	1400	1400	5	5	
			电杆(根)	14	14	5	5	
			检查井(个)	4	4	5	5	
			水塔	1	1	5	5	
			铺设管道(米)	3400	3400	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE管(mpa)	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE管(mpa)	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
		成本指标	项目实施资金成本(万元)	≤8	≤8	5	5	
		时效指标	项目(工程)完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
		效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数(人)	≥42	≥42	5	5
巩固提升脱贫户(含监测户)饮水安全人数(人)	≥13			≥13	5	5		
可持续影响指标	工程设计使用年限(年)		≥10	≥10	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	8	满意度未达到预期	
总分								



时间：2022年11月20日




## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		三川口镇牛薛沟村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施单位	牛薛沟村			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26	26	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 进一步巩固安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。</p> <p>2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>			<p>1. 进一步巩固安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。</p> <p>2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修水源井（眼）	1	1	10	10	
			水源蓄水池（个）	1	1	5	5	
			水塔（个）	1	1	5	5	
			铺设管道（米）	≥2100	≥2100	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
	水质化验通过率	100%	100%	5	5			
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤26	≤26	5	5		
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥456	≥456	5	5	
			巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥111	≥111	5	5	
可持续影响指标		工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥96%	10	8	满意度未达到预期	
总分					100	98		



时间：2022年11月20日

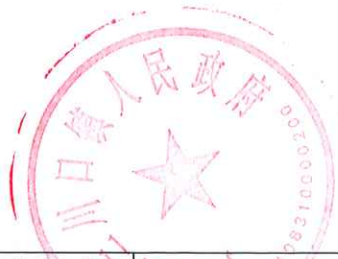

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		三川口镇香炉沟村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001			实施单位	三川口镇香炉沟村		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14	14	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固香炉沟安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			1. 进一步巩固香炉沟安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水井（眼）	1	1	5	5	
			水塔（个）	1	1	5	5	
			铺设管道（米）	≥2000	≥2000	5	5	
			水表（块）	50	50	5	5	
			检查井	16	16	5	5	
			水泵（个）	1	1	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制数（万元）	≤14	≤14	5	5		
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥82	≥82	5	5	
			巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥30	≥30	5	5	
可持续影响指标		工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥95%	10	8	满意度未达到预期	
总分						100	98	

时间：2022年11月20日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	三川口镇侯石畔安全饮水提升工程							
主管部门及代码	三川口镇人民政府 162001			实施单位	三川口镇侯石畔村			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 进一步巩固艾兴庄安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。</p> <p>2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>			<p>1. 进一步巩固艾兴庄安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。</p> <p>2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装变压器（台）	1	1	10	10	
			铺设管道（米）	≥2000	≥2000	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE 管（m）	≥1.6	≥1.6	10	10	
			DN50 PE 管（m）	≥1.6	≥1.6	10	10	
			水质化验检测是否达标	是	是	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤8	≤8	5	5	
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥42	≥42	5	5	
			巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥13	≥13	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥97%	≥97%	10	8	满意度未达到预期
总分					100	98		



时间：2022年11月20日

项目支出绩效自评表  
(2022年度)



项目名称		三川口镇高焉村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施单位	三川口镇高焉村			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	100%	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固高焉村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			1. 进一步巩固高焉村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修水源井（眼）	1	1	10	10	
			水泵（个）	1	1	5	5	
			铺设管道（米）	≥1020	≥1020	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			DN40 PE管（mpa）	≥1.6	≥1.6	10	10	
			DN50 PE管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤4	≤4	5	5		
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥137	≥137	5	5	
			巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥53	≥53	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	7	满意度未达到预期	
总分					100	97		



时间：2022年11月20日

项目支出绩效自评表  
(2022年度)



项目名称		三川口镇蛇沟村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施单位	三川口镇蛇沟村			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7	7	100%	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 进一步巩固蛇沟村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。</p> <p>2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>			<p>1. 进一步巩固蛇沟村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。</p> <p>2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	183米机井(眼)	2	2	5	5	
			水泵(个)	2	2	5	5	
			铺设管道(米)	≥100	≥100	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE管(mpa)	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE管(mpa)	≥1.6	≥1.6	15	15	
		水质化验检测是否达标	是	是	5	5		
	成本指标	项目实施资金成本(万元)	≤7	≤7	5	5		
	时效指标	项目(工程)完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5		
效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数(人)	≥13	≥13	5	5		
		巩固提升脱贫户(含监测户)饮水安全人数(人)	≥5	≥5	5	5		
	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥10	≥10	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	6	满意度未达到预期	
总分					100	96		

纪波  
6108310035012

时间: 2022年11月20日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)



项目名称		三川口镇田家沟安全饮水提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施单位		三川口镇田家沟村		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 进一步巩固田家沟安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。</p> <p>2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>			<p>1. 进一步巩固田家沟安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。</p> <p>2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标		水泵 (个)	1	1	5	5	
			水表 (块)	28	28	5	5	
			电线 (米)	1400	1400	5	5	
			电杆 (根)	14	14	5	5	
			检查井 (个)	4	4	5	5	
			铺设管道 (米)	≥3400	≥3400	5	5	
	质量指标		项目 (工程) 验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE 管 (mpa)	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE 管 (mpa)	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
	成本指标		项目实施资金成本 (万元)	≤16	≤16	10	10	



时间: 2022年11月20日

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		三川口镇阳湾村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施单位		三川口镇阳湾村		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 进一步巩固阳湾村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。</p> <p>2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>			<p>1. 进一步巩固阳湾村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。</p> <p>2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水源井（眼）	1	1	5	5	
			水泵（个）	1	1	5	5	
			水塔（个）	1	1	5	5	
			检查井（个）	15	15	5	5	
			机电设备（套）	1	1	5	5	
			水表（块）	50	50	5	5	
			铺设管道（米）	≥2800	≥2800	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
		成本指标	预算控制数（万元）	20	20	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥136	≥136	5	5	
			巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥23	≥23	5	5	
生态效益指标	带动农村产业发展	持续发展	持续发展	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	5	3	满意度未达到预期	
总分						98		



时间：2022年11月20日



## 项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称	三川口镇阳湾村特色农产品种植配套产业道路							
主管部门及代码	三川口镇人民政府			实施单位	三川口镇阳湾村			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；2.加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。3.建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。			1.维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；2.加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。3.建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产业道路长(米)	≥1000	≥1000	15	15	
			产业道路宽(米)	≥3.5	≥3.5	5	5	
			产业道路宽(米)	≥0.15	≥0.15	5	5	
			排水管道(米)	8	8	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数(万元)	40	40	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	改善产业发展条件	明显改善	3%	10	10	
		社会效益指标	受益户数(≥户)	≥78	≥78	5	5	
		生态效益指标	带动农村产业发展	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	93%	10	8	满意度未达到预期
总分						100	98	



时间：2022年11月20日

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)



项目名称		三川口镇袁阳湾村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施单位	袁阳湾村			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9	9	100%	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 进一步巩固安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。</p> <p>2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>			<p>1. 进一步巩固安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。</p> <p>2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水井（眼）	1	1	10	10	
			水塔（个）	1	1	5	5	
			铺设管道（米）	≥1480	≥1480	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤9	≤9	5	5		
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥156	≥156	5	5	
			巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥54	≥54	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥96%	≥95%	10	8	满意度未达到预期	
总分								

100 | 98

纪波

6108310035012

时间：2022年11月20日

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		三川口镇毕家砭村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施单位	毕家砭村			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9	9	100%	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			1. 进一步巩固安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水源井(眼)	2	2	10	10	
			铺设管道(米)	≥1200	≥1200	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE管(mpa)	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE管(mpa)	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目实施资金成本(万元)	≤9	≤9	5	5	
	时效指标	项目(工程)完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数(人)	≥186	≥186	5	5	
			巩固提升脱贫户(含监测户)饮水安全人数(人)	≥12	≥12	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥10	≥10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥96%	10	8	满意度未达到预期
总分					100	98		



时间: 2022年11月20日

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		三川口镇杜沟岔村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施单位	杜沟岔村			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	100%	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 进一步巩固安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>			<p>1. 进一步巩固安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人工挖井(口)	1	1	10	10	
			检查井(个)	4	4	5	5	
			铺设管道(米)	≥2000	≥2000	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE管(mpa)	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE管(mpa)	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目实施资金成本(万元)	≤8	≤8	5	5		
	时效指标	项目(工程)完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数(人)	≥115	≥115	5	5	
			巩固提升脱贫户(含监测户)饮水安全人数(人)	≥47	≥47	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥10	≥10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥97%	10	8	满意度未达到预期	
总分					100	98		

纪波  
6108310035012

时间:2022年11月15日

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		三川口镇西庄村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001			实施单位		西庄村	
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 进一步巩固安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。</p> <p>2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>			<p>1. 进一步巩固安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。</p> <p>2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	27方水源井（眼）	1	1	10	10	
			质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		DN40 PE管（mpa）		≥1.6	≥1.6	10	10	
		DN50 PE管（mpa）		≥1.6	≥1.6	5	5	
		水质化验通过率		100%	100%	5	5	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤5	≤5	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022年10月15号	2022年10月15号	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥30	≥30	5	5	
			巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥13	≥13	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥96%	10	8	满意度未达到预期
总分						100	98	



时间：2022年11月20日
