

# 子洲县 2022 年小理河电市镇李家河段 防洪工程绩效评价报告

委托单位：子洲县财政预算绩效评价中心

评价机构：陕西政诚汇鑫财税咨询有限公司

提交日期：2022 年 10 月 31 日

# 目录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 一、基本情况                          | 1         |
| (一) 项目概况                        | 1         |
| (二) 项目绩效目标                      | 2         |
| 二、绩效评价工作开展情况                    | 3         |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围                | 3         |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准     | 3         |
| (三) 评价依据                        | 5         |
| (四) 绩效评价工作过程                    | 6         |
| 三、综合评价情况及评价结论                   | 7         |
| (一) 综合评价情况                      | 7         |
| (二) 评价结论                        | 7         |
| 四、绩效评价指标分析                      | 8         |
| (一) 项目决策情况                      | 8         |
| (二) 项目过程情况                      | 11        |
| (三) 项目产出情况                      | 14        |
| (四) 项目效益情况                      | 14        |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析            | 15        |
| (一) 主要经验及做法                     | 15        |
| (二) 存在的问题                       | 16        |
| 六、有关建议                          | 16        |
| (一) 建立绩效意识，规范绩效目标设置             | 16        |
| (二) 完善相关管理制度，做到项目实施有据可循         | 16        |
| (三) 规范项目实施过程，提高项目管理水平           | 16        |
| 七、其他需要说明的问题                     | 错误！未定义书签。 |
| 附件 1：2021 年人居环境改造项目资金绩效评价体系及得分表 | 17-27     |

## 2022 年小理河电市镇李家河段防洪工程 绩效评价报告

|          |   |          |        |
|----------|---|----------|--------|
| 项目名称     | 2022 年小理河电市镇李家河段防洪工程  |          |        |
| 项目主管部门   | 子洲县水利局  |          |        |
| 项目实施单位   | 子洲县水利局  |          |        |
| 支出项目起止时间 | 2022 年完成  |          |        |
| 投资总金额    | 720 万元  |          |        |
| 其中：自筹资金  |   | 自有资金     |        |
|          |   | 信贷资金     |        |
| 财政补助资金总额 | 720 万元  | 上级财政补助   |        |
|          |   | 县本级补助    | 720 万元 |
|          |   | 区县配套金额   |        |
| 实际到位金额   | 720 万元  | 项目实际支出金额 | 720 万元 |
| 项目概况     | <p>子洲县 2022 年小理河电市镇李家河段防洪工程立项依据为《陕西省重点地区中小河流近期治理建设规划》项目和子洲县乡村振兴局子洲县财政局《关于下达 2021 年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》(子政乡振发【2021】19 号)；《关于下达 2021 年财政衔接推进乡村振兴整合资金项目计划的通知》(政乡镇发【2021】20 号)；《关于核减收回 2021 年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》(子政乡振发【2021】43 号)；《关于下达 2021 年财政衔接推进乡村振兴整合资金项目计划的通知》(子政乡振发【2021】69 号)，项目预算合计金额 720 万元，实际下达 720 万元。</p> |          |        |
| 项目绩效目标   | <p>保护项目区农田达到了 10 年一遇洪水标准，保证 2750 人居民生命财产安全，可保护耕地 1000 亩，为当地产业结构调整及经济社会可持续发展提供保证。具体绩效：1. 产权属于归国有资产，由水利局负责管护；2. 保护耕地约 998 亩；3. 左岸新建堤防长度 857.34 米、右岸新建堤防长度 2136.07 米。</p>  |          |        |
| 支出执行情况   | <p>子洲县水利局共收到 2022 年小理河电市镇李家河段防洪工程资金 720 万元，截至本次评价日，已支付资金 720 万元，资金支付率 100%。</p>   |          |        |
| 绩效评价结论   | <p>2022 年小理河电市镇李家河段防洪工程综合评价得分为 90 分。根据《子洲县人民政府办公室关于印发子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》(子政办发【2021】27 号)项目得分级别划分标准，本项目总体评价结果为优秀。</p>  |          |        |

# 2022 年小理河电市镇李家河段防洪工程资金绩效评价报告

为全面检验 2022 年小理河电市镇李家河段防洪工程资金的使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共中央国务院印发乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》、《陕西省重点地区中小河流近期治理建设规划》、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩【2020】9 号）和子洲县财政局《关于对人居环境改造等专项资金开展绩效评价工作的通知》的有关规定和要求，子洲县财政预算绩效评价中心委托陕西政诚汇鑫财税咨询有限公司，组织开展 2022 年小理河电市镇李家河段防洪工程项目绩效评价工作。我们审核了子洲县水利局提供的自评报告及相关资料，结合专家组的评审意见，形成了本评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程涉及电市镇李家河和庙台、马蹄沟镇巡检司、前吴家湾、后吴家湾共 5 个自然村，保护耕地约 998 亩，涉及人口约 2750 人。该河段设防标准较低，整条河段无堤防，河道过水断面两侧均为天然岸坡和农田田埂，河道狭窄，部分河道仅能通过三年一遇的洪水，10 年一遇洪水将会发生大面积滩面过流，沿河两岸近千亩农田经常受洪水侵害。目前防洪体系不完善、无堤防，以原始土坎农田埂道为主，导致现状河槽及两岸农田埂道受洪水淹没和冲刷破坏，两岸局部段均出现岸坡坍塌和掏空段。一旦发生洪水时，将会影响两岸村民的财产安全。工程建成后，保护项目区 2750 人居民生命财产安全，可保护耕地 1000 亩，为当地产业结构调整及经济社会可持续发展提供保证。属于公共财政支持范围。

主要建设内容：综合治理长度 3.5km，新建堤防总长 2993.41m，其中左岸新建堤防长度 857.34m，右岸新建堤防长度 2136.07m。工程概算总投资 3204.46 万元。

## 主要内容及实施情况

根据子洲县乡村振兴局、子洲县财政局《关于下达 2021 年财政衔接推进乡村振兴整合资金项目计划的通知》（子政乡镇发【2021】20 号）、《关于下达 2021 年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（子政乡振发【2021】19 号）、《关于核减收回 2021 年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划》（子政乡振发【2021】43 号）和《关于下达 2021 年财政衔接推进乡村振兴整合资金项目计划的通知》（子政乡振发【2021】69 号），共下达资金 720 万元，用于防洪工程项目。

项目的主要内容包括：综合治理长度 3.5km，新建提防总长 2993.41m，其中左岸新建提防长度 857.34m，右岸新建提防长度 2136.07m。截止本评价日，2022 年子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程项目已完工。

## 2. 资金投入和使用情况

子洲县水利局共收到 2022 年子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程资金 720 万元，截至本次评价日，资金使用具体情况如下表 1 所示：

表 1 2022 年子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程资金使用情况

| 序号 | 项目名称 | 项目内容           | 支付金额(万元) |
|----|------|----------------|----------|
| 1  | 防洪工程 | 小理河电市镇李家河段防洪工程 | 720      |
|    |      | 总计             | 720      |

### （二）项目绩效目标

根据子洲县水利局申报的绩效目标，本项目的总体绩效目标如下：

#### 1. 产出指标

##### （1）数量指标

治理河道长度 2.99341km。

##### （2）质量指标

工程验收合格率 100%；工程验收率 100%。

##### （3）时效指标

2022 年 10 月底完成。

##### （4）成本指标

预算控制金额 720 万元。

#### 2. 效益指标

(1) 社会效益指标

保护人口（人）3120。

(2) 可持续影响指标

工程是否达到设计使用年限，已建是否良性运行。

(5) 服务对象满意度指标

受益区群众满意度达到 95%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过绩效评价，衡量防洪工程项目资金绩效，评价防洪工程资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，并总结经验，分析存在的问题，有针对性地采取有效措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

#### 2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象是“2022 年子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程资金”，涉及资金 720 万元。本次评价主要以本项目内容为基础，动态地对项目决策、过程、产出和效益四个方面进行绩效评价。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

#### 1. 评价原则

本次评价遵循目标导向性原则、科学客观性原则和公平公正性原则，评价组在开展本次绩效评价时遵循以下基本原则：

(1) 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、生态效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作

性，符合成本效益原则。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家与项目承担单位无任何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

（8）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## **2. 评价指标体系**

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10号）（以下简称“财预10号文”）的规定，评价组与子洲县财政预算绩效评价中心在原有申报年度预算支出绩效目标基础上，共同修改、设置、制定用于此次绩效评价的指标体系以及相应的评分细则；评价指标设置三级，其中一级指标4个，二级指标14个，三级指标30个（具体指标设置及评价标准详见附件1）。指标内容主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分100分。

## **3. 评价方法**

本项目进行绩效评价时采用比较法、层次分析法、公众评判法、因素分析法等方法对2022年子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程资金的投入、产出和效益做出客观、公正的评价。

（1）比较法：通过比较项目实施产生的实际结果与预定目标，找出差异与不足，对项目的各项绩效目标进行分析与评价。

（2）层次分析法：结合“财预10号文”内容，制定项目绩效评价指标体系，应用该体系进行评价。

（3）公众评判法：通过开展较为广泛的公众问卷调查和抽样分析，对项目产生的效果进行评判，以评价绩效目标实现程度。

（4）因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

## **4. 评价标准**

本次评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据子洲县人民政府办公室《关于印发子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》

（子政办发【2021】27号），按照最终得分将绩效评价结果分为四个等级：

综合得分在70分以下为差；

综合得分在70-80分（含70分）为一般；

综合得分在80-89分（含80分）为良好；

综合得分在90-100分（含90分）为优秀。

### （三）评价依据

1. 中央关于防洪工程的方针政策和文件。中共中央国务院《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》、中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、《陕西省重点地区中小河流近期治理建设规划》等政策文件。

2. 陕西省财政厅、农业厅等部门制定下发的财政专项资金管理的有关规章和其他规范性文件。《陕西省农业农村厅关于印发〈陕西省农业财政专项项目管理办  
法〉的通知》（陕农发【2019】104号）、《陕西省省级财政专项资金管理办法》（陕政发【2018】25号）、《陕西省人民政府关于进一步加强财政专项资金管理和改革的意见》（陕政发【2013】4号）、《陕西省重点地区中小河流近期治理建设规划》等政策文件。

3. 榆林市下发的财政专项资金管理的有关规章和其他规范性文件。《榆林市人民政府〈关于全面推进预算绩效管理的意见〉的通知》（榆政发【2018】1号）、《关于落实〈中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（榆办字【2019】129号）、《陕西省重点地区中小河流近期治理建设规划》等政策文件。

4. 子洲县下发的财政专项资金管理的有关规章和其他规范性文件。《子洲县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（子财发【2019】235号）、《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发【2019】73号）、《关于印发〈子洲县财政绩效评价暂行办法〉的通知》（子政发【2020】11号）、《关于印发〈子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法〉的通知》（子政办发【2021】27号）等政策文件。

5. 资金拨付文件及相关资料。

6. 子洲县农业农村局项目支出凭证、附件等资料。

7. 其他相关依据。



#### **（四）绩效评价工作过程**

评价组通过广泛收集项目资料并分析项目情况，采用查阅资料、深度访谈与问卷调查相结合的方法收集一手数据，通过对资料分析、研究、总结，运用对比法、逻辑分析法对项目评分，得出项目取得的成绩，指出项目存在的问题，提出相关建议。

2022年10月初，评价组积极与项目单位联系，了解项目概况，包括项目的内容、管理制度和资金流程等，并对相关项目进行了走访调研，包括访谈负责人、数据材料收集等，于10月上旬完成了前期调研工作，明确了绩效评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准和社会调查方案等。10月下旬，评价组严格按照工作方案经历了数据采集、重点复核、问卷调查、社会访谈、数据分析和报告撰写环节，顺利完成了绩效评价工作。

本次财政资金绩效评价工作计划分为四个阶段：

##### **1. 前期准备阶段**

接受子洲县财政预算绩效评价中心委托后，为保证本次绩效评价工作顺利开展，充分把控项目风险及项目绩效管理相关工作成果和质量，我公司与委托单位沟通落实绩效评价工作的具体要求；此外，我公司内部召开绩效评价工作部署会议，成立绩效评价工作组，制定项目工作计划，对评价组成员提出任务、职业道德和保密工作要求。

项目评价组深入学习了财政支出绩效评价和项目管理方面的制度和政策，学习了项目评价指标体系和项目评价方案，并明确评价工作开展程序及阶段性要求，拟定《2022年子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程资金绩效评价体系及得分表》。我公司在征求子洲县财政预算绩效评价中心意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善后，提交子洲县财政预算绩效评价中心。

##### **2. 组织实施阶段**

评价组按照绩效评价实施方案和绩效评价指标体系，组织赴项目单位调研，现场考察与收集初步资料，采集政策文件、操作办法、管理制度、项目的基本信息等，确定评价的方向和评价的重点等内容；依据评价指标体系搜集项目业务、财务资料，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；对搜集的资料进行分类、整理，开展资金使用情况调查工作；加强与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会，撰写调研的阶段情况综合报告。

### 3. 实地核查

为保证绩效评价数据的真实、完整，此次评价对抽取项目进行实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和询问，保证项目资料的真实性；另一方面对项目建设内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

### 4. 分析评价

按照制定的绩效评价指标体系，根据收集的资料、访谈与问卷调查等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。在前期资料收集、访谈、问卷调查、分析研究、归纳总结的基础上，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，组长负责报告的总纂；与项目单位沟通并修改完善后，形成正式绩效评价报告，包括相关文本文件和附件；根据专家评审意见，进一步修改优化评价报告，并协助委托方和项目主管单位进行后续整改工作。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

本次绩效评价工作在绩效专家及行业专家的指导下，根据现场评价情况和资金使用单位的自评材料，评价小组认为，2022年子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程资金在保护耕地面积、两岸村民财产安全和人民生活幸福度等方面发挥了重要作用。但是，资金使用过程中也存在着绩效指标设置缺乏合理性、个别绩效指标设置与项目文件的建设内容不符及绩效指标设置不全面；未开展项目绩效自评、项目后续管护机制不完善等问题。综合评定，本专项资金的绩效评分为90分，绩效表现为优秀。

### （二）评价结论

评价小组在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，并结合子洲县县农业农村局对项目的组织监督和管理情况，依据项目绩效评价指标体系进行评分，子洲县2022年子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程资金绩效评价综合得分为90分，评价等级为优秀。具体评分见下表：

表2 2022年子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程资金指标评分表

| 项目   | 标准分值  | 评价得分  | 得分率  |
|------|-------|-------|------|
| 决策指标 | 25.00 | 23.00 | 92%  |
| 过程指标 | 17.00 | 17.00 | 100% |

| 项目   | 标准分值   | 评价得分  | 得分率    |
|------|--------|-------|--------|
| 产出指标 | 28.00  | 23.00 | 82.14% |
| 效益指标 | 30.00  | 27.00 | 90.00% |
| 分数合计 | 100.00 | 90.00 | 90.00% |

图 1 一级指标得分示意图

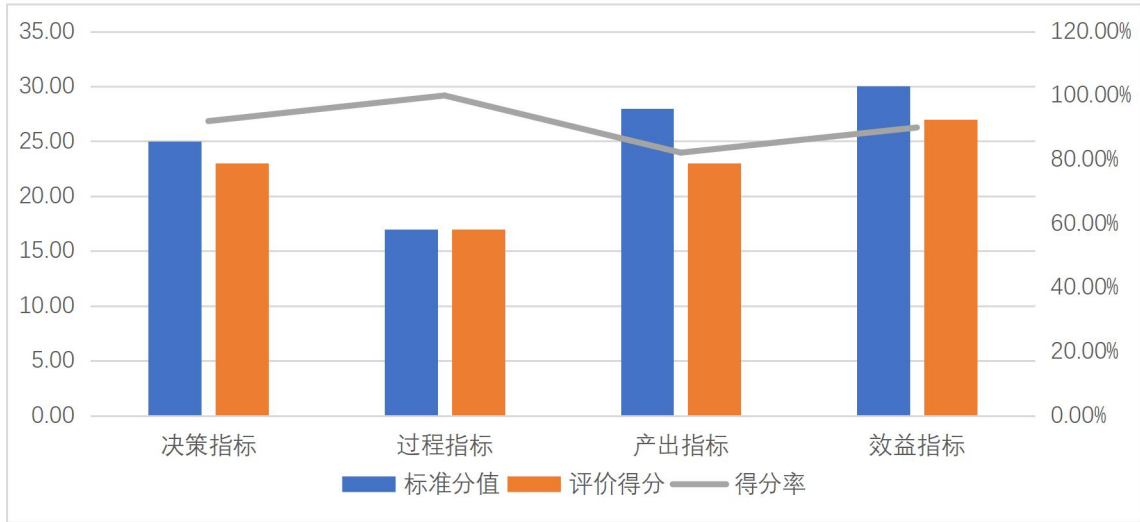


图 2 二级指标得分示意图

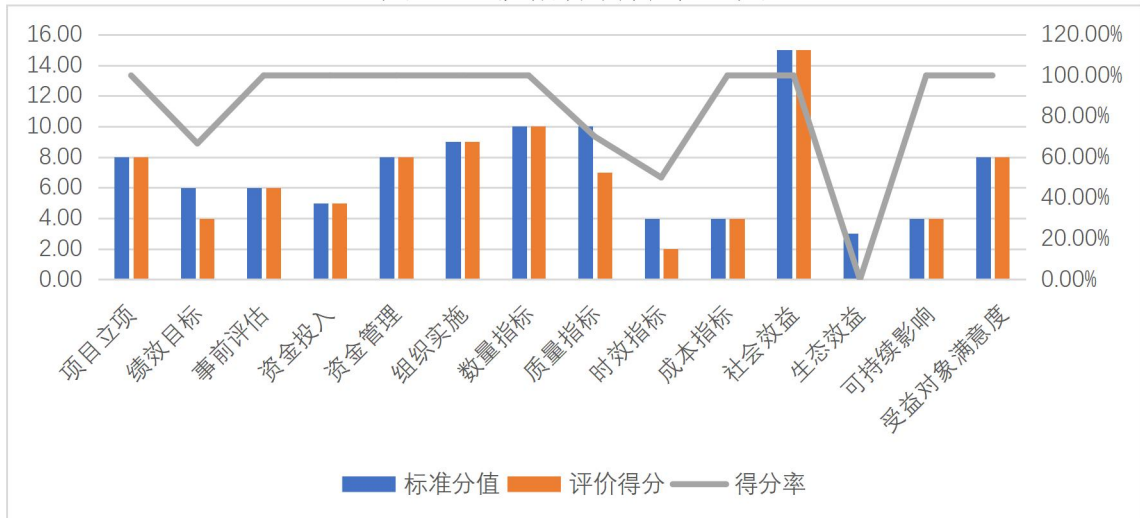


图 1、2 显示，在决策指标、过程指标、产出指标和效益指标四方面，过程指标和效益指标得分较高，反映出 2022 年子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程实施程序合法合规，项目产出的效益较好，产出指标得分较低，反映出子洲县水利局内部项目管理制度和项目管理水平有待提升。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目决策指标主要包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面内容，共细化为 9 个三级指标，权重分 25.00 分，本次评价得分 23.00 分，得分率为 92%，评分

详细如下：

表 3 项目决策得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 标准分值  | 评价得分  | 得分率     |
|------|------|-------|-------|---------|
| 决策指标 | 项目立项 | 8.00  | 8.00  | 100.00% |
| 决策指标 | 绩效目标 | 6.00  | 4.00  | 66.67%  |
| 决策指标 | 事前评估 | 6.00  | 6.00  | 100.00% |
| 决策指标 | 资金投入 | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
| 合计   |      | 25.00 | 23.00 | 92.00%  |

### 1. 项目立项

该指标分值 8.00 分，本次评价得分 8.00 分。本指标主要从立项依据充分性和项目立项规范性两个方面进行评价。经评价，本项目立项符合相关政策，立项程序规范，该指标得 8.00 分。

表 4 项目立项得分情况表

| 二级指标 | 三级指标    | 标准分值 | 评价得分 | 得分率     |
|------|---------|------|------|---------|
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 项目立项 | 项目立项规范性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 合计   |         | 8.00 | 8.00 | 100.00% |

(1) 立项依据充分性，该指标分值 4.00 分，本次评价得 4.00 分，主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。经查看项目资料，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，该指标得 4.00 分。

(2) 项目立项规范性，该指标分值 4.00 分，本次评价得 4.00 分，主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。经查看项目资料，本项目申请程序规范，该指标得 4.00 分。

### 2. 绩效目标

该指标分值 6.00 分，本次评价得分 4.00 分。绩效目标从绩效目标合理性、绩效指标明确性和绩效指标全面性三个方面进行评价。经评价，本项目绩效指标设置较为合理，指标数量与计划数相符，但是部分绩效指标不合理、不清晰，缺少细化、分解，难以准确衡量，不利于发挥目标的导向作用，部分绩效目标设置不全面，绩效目标的合理性、绩效指标明确性和全面性各扣 1.00 分，该指标得 4.00

分。

表 5 绩效目标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标     | 标准分值 | 评价得分 | 得分率     |
|------|----------|------|------|---------|
| 绩效目标 | 绩效目标合理性  | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 绩效目标 | 绩效目标的明确性 | 2.00 | 1.00 | 50.00%  |
| 绩效目标 | 绩效目标的全面性 | 2.00 | 1.00 | 50.00%  |
| 合计   |          | 6.00 | 4.00 | 66.67%  |

(1) 绩效目标合理性, 该指标分值 2.00 分, 本次评价得 2.00 分, 主要考核项目所设定的绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价组查看了本项目的绩效目标表, 绩效目标合理。该指标得 2.00 分。

(2) 绩效目标明确性, 该指标分值 2.00 分, 本次评价得 1.00 分, 主要考核依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价组查看了本项目的绩效目标表, 本项目将绩效目标分解为较为具体细化的二级绩效指标, 项目任务相对具体, 绩效目标较为清晰, 内容较为细化, 但个别绩效目标与目标任务数数不符合, 如: 项目单位只提供了该项目整体的绩效目标, 未提供该段工程的绩效目标, 该指标综合扣 1 分, 得 1.00 分。

(3) 绩效目标全面性, 该指标分值 2.00 分, 本次评价得 1.00 分, 主要考核依据绩效目标设置的绩效指标是否全面有效的反映绩效目标的实现情况。评价组查看了本项目的绩效目标表, 部分绩效指标不够全面, 如: 绩效指标并不能有效的反映该段工程的绩效目标, 该指标综合扣 1.00 分, 得 1.00 分。

### 3. 事前评估

该指标分值 6.00 分, 本次评价得分 6.00 分。事前评估从项目预评估和评估等级两个方面进行评价。经评价, 本项目部门开展项目预评估工作, 并且形成报告报送财政部门, 评估报告在 90 分以上。

表 6 事前评估得分情况表

| 二级指标 | 三级指标   | 标准分值 | 评价得分 | 得分率     |
|------|--------|------|------|---------|
| 事前评估 | 项目预评估  | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 事前评估 | 项目评估等级 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 合计   |        | 6.00 | 6.00 | 100.00% |

(1) 项目预评估：该指标分值 3.00 分，本次评价 3.00 分，主要考核项目前期的预评估程序开展情况。评价组查看了本项目的预评估资料，部门开展项目预评估工作，并且形成报告报送财政部门。预评估报告符合程序，该指标得 3.00 分。

(2) 项目评估等级：该指标分值 3.00 分，本次评价 3.00 分，主要考核项目前期的预评估报告得分情况。评价组查看了本项目的预评估资料，部门开展项目预评估工作，评估报告在 90 分以上。得分合理，该指标得 3.00 分。

#### 4. 资金投入

该指标分值 5.00 分，本次评价得分 5.00 分。资金投入从预算编制科学性和资金分配合理性两个方面进行评价。经评价，本项目预算编制科学，资金分配合理。

表 7 资金投入得分情况表

| 二级指标 | 三级指标    | 标准分值 | 评价得分 | 得分率     |
|------|---------|------|------|---------|
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 合计   |         | 5.00 | 5.00 | 100.00% |

##### (1) 预算编制科学性

该指标分值 3.00 分，本次评价得 3.00 分，主要考核项目预算编制是否经过科学论证，标准是否明确，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映项目预算编制的科学性和合理性情况。经检查项目资料，本项目投资额编制经过科学论证且编制标准明确，该指标得 3.00 分。

##### (2) 资金分配合理性

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映项目预算资金分配的科学性和合理性情况。经检查项目资料，本项目预算资金有测算依据，资金分配比较科学合理，该指标得 2.00 分。

#### (二) 项目过程情况

项目过程指标主要包括资金管理和组织实施两方面内容，共细化为 8 个三级指标，权重分 17.00 分，本次评价得分 17.00 分，得分率为 100.00%，评分详细

如下：

表 8 项目过程得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 标准分值  | 评价得分  | 得分率     |
|------|------|-------|-------|---------|
| 过程指标 | 资金管理 | 8.00  | 8.00  | 100.00% |
| 过程指标 | 组织实施 | 9.00  | 9.00  | 100.00% |
| 合计   |      | 17.00 | 17.00 | 100.00% |

### 1. 资金管理

该指标分值 8.00 分，本次评价得分 8.00 分。资金管理从资金到位率、资金到位及时率、预算执行率和资金使用合规性四个方面进行评价。经评价，本项目资金及时全部到位，具体评分如下：

表 9 项目管理得分情况表

| 二级指标 | 三级指标    | 标准分值 | 评价得分 | 得分率     |
|------|---------|------|------|---------|
| 资金管理 | 资金到位率   | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 资金管理 | 资金到位及时率 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 资金管理 | 预算执行率   | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 合计   |         | 8.00 | 8.00 | 100.00% |

#### (1) 资金到位率

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目实际到位资金与计划应投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。经检查相关资料，资金到位率 100%，该指标得 2.00 分。

#### (2) 资金到位及时率

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目到位资金的及时性，用以反映和考核财政或项目主管部门对资金落实的及时性程度。经检查相关资料，资金及时到位，该指标得 2.00 分。

#### (3) 预算执行率

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。经检查相关资料，截止评价日，本项目实际支出资金 720 万元，预算执行率=720 /720 =100.00%，该指标得 2.00 分。

#### (4) 资金使用合规性

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。经检查相关资料，本项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金的使用有较为完整的审批程序和相关资料，不存在截留、挪用、虚列支出等情况，该指标得 2.00 分。

## 2. 组织实施

该指标分值 9.00 分，本次评价得分 9.00 分。组织实施从管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性三个方面进行评价。经评价，本项目制度建设完善，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目未进行调整及支出调整；项目合同书、验收报告、政府采购等资料齐全并及时归档，具有相应的项目质量要求及标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段，得 9.00 分。

表 10 组织实施得分情况表

| 二级指标 | 三级指标    | 标准分值 | 评价得分 | 得分率     |
|------|---------|------|------|---------|
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 组织实施 | 项目质量可控性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 合计   |         | 9.00 | 9.00 | 100.00% |

### (1) 管理制度健全性

该指标分值 3.00 分，本次评价得 3.00 分，主要考核项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。经检查相关资料，本项目制定了项目管理制度，得 3.00 分。

### (2) 制度执行有效性

该指标分值 3.00 分，本次评价得 3.00 分，主要考核项目实施是否符合相关业务管理制度规定，用以考核管理制度的有效执行情况。经检查相关资料，本项目制定项目管理制度，但项目实施遵守相关法律法规和管理制度的规定，项目合同书、验收报告和政府采购等资料齐全并及时归档，该指标得 3.00 分。

### (3) 项目质量可控性

该指标分值 3.00 分，本次评价得 3.00 分，主要考核项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。经检查相关资料，本项目制定相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目验收等必需的控制措施或手段，该指标得 3.00 分。



### （三）项目产出情况

项目产出指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四方面内容，共细化为7个三级指标，权重分28.00分，本次评价得分23.00分，得分率为82.14%，评分详细如下：

表 11 项目产出得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 标准分值  | 评价得分  | 得分率     |
|------|------|-------|-------|---------|
| 产出指标 | 数量指标 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 产出指标 | 质量指标 | 10.00 | 7.00  | 70.00%  |
| 产出指标 | 时效指标 | 4.00  | 2.00  | 50.00%  |
| 产出指标 | 成本指标 | 4.00  | 4.00  | 100.00% |
| 合计   |      | 28.00 | 23.00 | 82.14%  |

#### 1. 数量指标

该指标分值10.00分，本次评价得分10.00分。本指标用以考核2022年子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程目标数量的完成情况。截至评价日，本项目建设任务全部完成，该指标得10分。

#### 2. 质量指标

该指标分值10.00分，本次评价得分7.00分。本指标用以反映和考核子洲县子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程质量是否验收合格，是否符合国家规定的标准、以及项目绩效目标开展情况。截至评价日，已完工的项目均通过了验收，验收结论合格，但未进行绩效自评工作，扣3分，该指标得7分。

#### 3. 时效指标

该指标分值4.00分，本次评价得分2.00分。本指标主要考核项目单位是否能按计划和要求完成任务。经检查相关资料，本项目未按时开展，该指标综合扣2分，该指标得2分。

#### 4. 成本指标

该指标分值4.00分，本次评价得分4.00分。本指标用以反映和考核项目支出是否控制在预算金额范围内。经检查相关资料，实际支出低于项目立项文件中财政资金预算金额，该指标得4.00分。

### （四）项目效益情况

项目效益包括项目所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和受益对象满意度五个方面。共细化为6个三级指标，权重分30.00分，本次评价

得分 27.00 分，得分率为 90.00%，评分详细如下：

表 12 项目效益得分情况表

| 一级指标 | 二级指标    | 标准分值  | 评价得分  | 得分率     |
|------|---------|-------|-------|---------|
| 效益指标 | 社会效益    | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| 效益指标 | 生态效益    | 3.00  | 0.00  | 0.00%   |
| 效益指标 | 可持续影响   | 4.00  | 4.00  | 100.00% |
| 效益指标 | 受益对象满意度 | 8.00  | 8.00  | 100.00% |
| 合计   |         | 30.00 | 27.00 | 90.00%  |

### 1. 社会效益

该指标分值 15.00 分，本次评价得分 15.00 分。社会效益从受益人口数、受益防返贫监测对象人数和保护耕地面积三个方面进行评价。通过估算和丈量，认为防洪工程在前述三个方面的实际完成数与预期一致，任务完成，该指标得 15.00 分。

### 2. 生态效益

该指标分值 3.00 分，本次评价得分 0.00 分。本指标从项目建设中对绿化环境影响进行评价。通过建设防洪工程项目，项目实施中，并无绿化一项，该指标扣 3.00 分，得 0.00 分。

### 3. 可持续影响

该指标分值 4.00 分，本次评价得分 4.00 分。可持续影响从考核项目建设可正常使用时间方面进行评价。通过村民调查问卷结果统计，通过考察工程设计使用年限，工程可使用年限 30 年，该指标得 4.00 分。

### 4. 受益对象满意度

该指标分值 8.00 分，本次评价得分 8.00 分。本指标从受益乡村和受益群众的满意度两个方面进行评价。通过向受益乡村和受益群众发放满意度调查问卷，经过对问卷结果统计，受益乡村和受益群众对本项目的满意度在 90%以上，该指标得 8.00 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

2022 年子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程的实施，为电市集镇及周边居民生命财产安全和经济社会可持续发展提供了有力保证。

## **（二）存在的问题**

### **1. 绩效评价意识薄弱，未开展绩效自评。**

项目主管单位相关人员对绩效评价的观念和认识尚不到位，不熟悉绩效评价内容和评价基本流程，未按照全面实施预算绩效管理办法进行绩效管理。

### **2. 项目实施不规范，项目管理水平不高**

项目计划未能如期开展，在评价过程中发现，2022 年子洲县小理河电市段防洪工程未能按时开工。

## **六、有关建议**

### **（一）树立绩效意识，规范绩效目标设置**

建议子洲县农业农村局建立绩效意识，所有项目应设置明确全面的绩效目标。进一步提高绩效指标编制的科学化和精细化水平，加强对产出指标和效益指标等具体量化指标的设置，全面准确地评价项目实施后的绩效情况。

### **（二）规范项目实施过程，提高项目管理水平**

建议子洲县水利局，严格按照项目进度安排资金支付，确保项目资金能按照工程进度，拨付到工程方。

附件：1. 2022 年子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程资金绩效评价体系及得分表

附件 1：2022 年子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程资金绩效评价体系及得分表

| 序号 | 一级指标        | 二级指标         | 三级指标    | 分值 | 指标解释   | 评分标准  | 得分   | 扣分依据                            |
|----|-------------|--------------|---------|----|--|---|------|---------------------------------|
| 1  | 决策<br>(25分) | 项目立项<br>(8分) | 立项依据充分性 | 4  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；<br>②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；<br>③项目是否属于工程建设支持范围（1分）；<br>④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。 | 4.00 |                                 |
| 2  |             |              | 项目立项规范性 | 4  | 项目的申请，设立过程是否符合相关要求，用以考核项目立项的规范情况。                  | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）；<br>②所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。                                      | 4.00 |                                 |
| 3  |             | 绩效目标<br>(6分) | 绩效目标合理性 | 2  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>①绩效目标是否与项目建设具有相关性（1分）；<br>②项目预期产出效益和效果是否不低于立项文件要求的最低要求（1分）。  | 2.00 |                                 |
| 4  |             |              | 绩效指标明确性 | 2  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且与目标任务数数符合（1分）；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）。   | 1.00 | 项目单位只提供了该项目整体的绩效目标，未提供该段工程的绩效目标 |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标         | 分值    | 指标解释   | 评分标准  | 得分  | 扣分依据                  |  |
|----|------|----------------|--------------|-------|--|---|---|-----------------------|--|
| 5  |      | 事前绩效评估<br>(6分) | 绩效指标全面性      | 2     | 依据绩效目标设置的绩效指标是否全面有效的反映绩效目标实现情况。                              | 评价要点：<br>①绩效指标是否全面、有效地反映绩效目标（1分）；<br>②绩效指标设置是否存在避重就轻或指标值不合理的情况（1分）。   | 1.00  | 绩效指标并不能有效的反映该段工程的绩效目标 |  |
| 6  |      |                | 项目预评估        | 3     | 依据项目申请部门（单位）是否开展项目预评估工作。                                     | 评价要点：<br>部门（单位）开展项目预评估工作，并且形成报告报送财政部门得满分，不开展不得分。  | 3.00  |                       |  |
| 7  |      |                | 项目评估等级       | 3     | 根据评估报告扣分项目整改情况。  | 评价要点：<br>评估报告90分以上得满分（含90分），90分以下的根据评估报告扣分项目整改率乘以分值。  | 3.00  |                       |  |
| 8  |      | 资金投入<br>(5分)   | 预算编制科学性      | 3     | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证（1.00分）；<br>②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1.00分）；<br>③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1.00分），项目投资额的实际签订的合同金额每偏离1个百分点，扣0.10分，扣完为止。 | 3.00  |                       |  |
| 9  |      |                | 资金分配合理性      | 2     | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。        | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分（1分）；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。   | 2.00  |                       |  |
| 10 |      | 过程<br>(17分)    | 资金管理<br>(8分) | 资金到位率 | 2  | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的  | 评价要点：<br>①资金到位率100%，且按规定时间及时到位，得满分；<br>②其他情况，在按满分乘以到位率计算得分的基础上，综合考虑未全额到位、超额到位、未 | 2.00                  |  |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标    | 分值 | 指标解释   | 评分标准   | 得分   | 扣分依据 |
|----|------|----------|---------|----|--|--|------|------|
|    |      |          |         |    | 总体保障程度。  | 及时到位的原因等因素核定得分，若到位资金超过预算金额，每超10%以内扣0.5分，扣完为止。  |      |      |
| 11 |      |          | 资金到位及时率 | 2  | 是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度。                            | 评价要点：<br>资金到位及时率=(实际已及时到位资金/应到位资金)×100%。<br>①到位及时率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分为：指标分值×到位及时率；<br>②到位及时率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分为0。                        | 2.00 |      |
| 12 |      |          | 预算执行率   | 2  | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                    | 评价要点：<br>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。<br>预算执行率=100%得2分，未达到100%的按比例得分，超过100%的，每超过10个百分点，扣0.01分，扣完为止。   | 2.00 |      |
| 13 |      |          | 资金使用合规性 | 2  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.50分)；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.50分)；<br>③是否符合项目预算批复规定的用途(0.50分)；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(0.50分)。 | 2.00 |      |
| 14 |      | 组织实施(9分) | 管理制度健全性 | 2  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1分)；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。   | 2.00 |      |

| 序号 | 一级指标          | 二级指标          | 三级指标                         | 分值 | 指标解释  | 评分标准   | 得分   | 扣分依据 |
|----|---------------|---------------|------------------------------|----|---|--|------|------|
| 15 |               |               | 制度执行有效性                      | 2  | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定(0.5分);<br>②项目调整及支出调整手续是否完备(0.5分);<br>③项目合同书、验收报告、政府采购等资料是否齐全并及时归档(1分)。 | 2.00 |      |
| 16 |               |               | 项目质量可控性                      | 2  | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(1分);<br>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段(1分)。                          | 2.00 |      |
| 17 |               |               | 事中绩效目标监控                     | 3  | 项目事中绩效目标监控报告的完整性、真实性及合理性。                           | 评价要点:<br>①绩效监控报告中各项指标与绩效目标一致,各要素填写完整(1分);<br>②绩效监控报告中各项数据与实际情况一致、真实(1分);<br>③绩效监控报告中各项数据填报合理(1分)。  | 3.00 |      |
| 18 | 项目产出<br>(28分) | 数量指标<br>(10分) | 左岸新建堤防长度                     | 5  | 用以考核建设任务的完成情况。                                      | 评价要点:<br>根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分,完成比例低于50%不得分。   | 5.00 |      |
| 19 |               |               | 右岸新建堤防长度                     | 5  | 用以考核建设任务的完成情况。                                      | 评价要点:<br>根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分,完成比例低于50%不得分。   | 5.00 |      |
| 20 |               | 质量指标<br>(10分) | 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 | 2  | 是否符合工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率                    | 评价要点:<br>发现一处不符合要求扣1分,扣完为止。  | 2.00 |      |

| 序号 | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标     | 分值      | 指标解释                           | 评分标准  | 得分   | 扣分依据      |         |
|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------------|---|--|-----------|---------|
| 21 |           |           | 项目验收合格率  | 4       | 用以考核项目建设质量是否合格。                | 评价要点：<br>验收合格率≥90%得满分，每降低一个百分点，扣0.5分，扣完为止。  | 4.00   |           |         |
| 22 |           |           | 项目绩效自评   | 4       | 项目绩效自评及时、报告内容完整性、准确性、合理性。      | 评价要点：<br>①绩效自评按时组织自评（1分）；<br>②绩效自评报告内容完整，无缺项，无漏项（1分）；<br>③绩效自评报告准确，与绩效目标及绩效监控内容一致（1分）；<br>④绩效自评报告合理，各项内容无逻辑性错误（1分）。 | 1.00   | 未开展绩效自评工作 |         |
| 23 |           |           | 时效指标（4分） | 任务完成及时性 | 4                              | 用以考核项目建设任务按计划批复规定时间完成情况。  | 评价要点：<br>按照实施方案或者项目立项文件，是否能按计划和要求完成任务。全部完成得满分，未全部完成按照完成程度百分比得分，未完成不得分。 | 2.00      | 项目未如期开工 |
| 24 |           |           | 成本指标（4分） | 项目成本控制率 | 4                              | 用以考核项目支出是否控制在预算金额范围内。   | 评价要点：<br>以项目立项文件中财政资金为标准，实际支出低于等于预算金额得满分；超过预算金额的，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。   | 4.00      |         |
| 25 | 项目效益（30分） | 社会效益（15分） | 受益总人数    | 5       | 用以考核项目建设后，项目区内直接受益的人口总数量。      | 评价要点：<br>通过估算项目区直接受益的总人口数，与初步设计文件的目标对比进行评价，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。   | 5.00   |           |         |
| 26 |           |           | 防返贫监测对象  | 5       | 用以考核项目建设后，项目区内直接防返贫监测对象的人口总数量。 | 评价要点：<br>通过估算项目区直接受益的总人口数，与初步设计文件的目标对比进行评价，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。   | 5.00   |           |         |
| 27 |           |           | 保护耕地（亩）  | 5       | 用以考核项目建设后，对可使用耕地保护情况。          | 评价要点：<br>通过丈量项目实际保护耕地数量，与初步设计文件的目标对比进行评价，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。   | 5.00   |           |         |



| 序号 | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标      | 分值     | 指标解释                  | 评分标准   | 得分    | 扣分依据        |
|----|--------|--------------|-----------|--------|-----------------------|--|-------|-------------|
| 28 |        | 生态效益指标 (3分)  | 绿化面积      | 3      | 考核项目建设中对绿化环境影响。       | 评价要点：<br>通过丈量项目实际绿化数量，与初步设计文件的目标对比进行评价，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。  | 0.00  | 建设内容，无绿化项目。 |
| 29 |        | 可持续影响指标 (4分) | 工程设计使用年限  | 4      | 考核项目建设可正常使用时间。        | 评价要点：<br>该项目的正常使用时长是否能达到预计年限，根据项目建设质量及验收情况而定 (6分)。   | 4.00  |             |
| 30 |        | 受益对象满意度 (8分) | 受益群众 (8分) | 8      | 项目建设后，受益群众对项目建设的满意程度。 | 评价要点：<br>通过走访或问卷调查，分析项目区土地权益人对防洪工程建设的总体满意程度。调查人员为项目区成年人。当调查满意的人数占调查总人数的比值超过 90%时得 4 分，其余根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。 | 8.00  |             |
| 合计 | 100.00 | 100.00       |           | 100.00 |                       |  | 90.00 |             |
