

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：三川口镇西庄安全饮水提升工程

自评项目单位：子洲县三川口镇人民政府

项目主管部门：子洲县人民政府

项目单位法人代码：11610831735380120G

评价工作组负责人：纪波 (签章)

联系人：李文萱

联系电话：15091899880

评价时间：2022年10月10日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇西庄安全饮水提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施单位	三川口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固西庄安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			1. 进一步巩固西庄安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	刘启首自然村维修水塔（座）	1	1	10	10	
			管网（米）	320	320	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN32 PE管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目实施资金成本万元	≤6	≤6	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022年6月30日前	2022年6月30日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数（人）	≥75	≥75	10	10	
			解决脱贫户饮水安全问题人数（人）	≥26	≥26	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6	≥6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥96%	10	8	满意度未达到预期
	总分					100	98	

安全饮水提升项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

子政乡振发[2022] 26 号（中央），子财发〔2021〕425 号文件实施项目。

2. 项目建设内容：

三川口镇西庄刘启首自然村维修水塔 1 个、管网 320 米

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		三川口镇西庄安全饮水提升工程				
主管部门		三川口镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	8			
		其中：财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 进一步巩固西庄安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活 and 生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			1. 进一步巩固西庄安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活 and 生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	刘启首自然村维修水塔（座）	1	1	
			管网（米）	320	320	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
			DN32 PE 管（mpa）	≥ 1.6	≥ 1.6	
		水质化验通过率	100%	100%		

	成本指标	项目实施资金成本万元	≤6	≤6	
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022年6月30日前	2022年6月30日前	
	社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数（人）	≥75	≥75	
		解决脱贫户饮水安全问题人数（人）	≥26	≥26	
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6	≥6	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥96%	满意度未达到预期

1. 总体目标：

进一步巩固西庄安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

2. 年度目标：

进一步巩固西庄安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金，安全饮水提升项目总投资投入为6万元，资金已于2022年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止2022年6月8日，安全饮水提升项目资金6万元全部支付，项目资金6万元已经全部用于安全饮水提升项目。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022. 3. 24	一般公共预算	安全饮水提升项目	3
2	2022. 6. 8	一般公共预算	安全饮水提升项目	3
合计				6

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

三川口镇人民政府安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣 2 分、得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237 号）。

四、存在问题与改进措施



（一）存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。

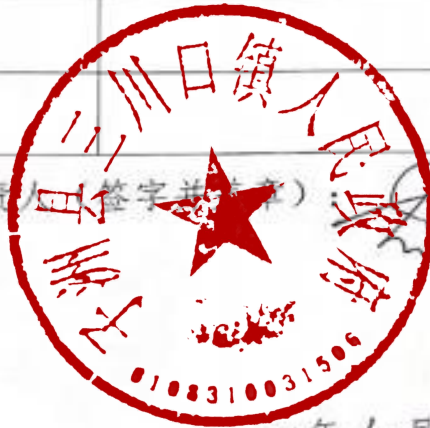
（二）改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价 人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	李小鸿	书记	子洲县三川口镇人民政府	
	纪波	镇长	子洲县三川口镇人民政府	
	李文莹	会计	子洲县三川口镇人民政府	李文莹

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）



2020年10月10日
