

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：三川口镇祥水沟村产业道路建设

自评项目单位：子洲县三川口镇人民政府

项目主管部门：子洲县人民政府

项目单位法人代码：11610831735380120G

评价工作组负责人：纪波 310031506 (签章)

联系人：李文萱

联系电话：15091899880

评价时间：2022年10月10日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		三川口镇祥水沟村产业道路建设						
主管部门及代码		三川口镇人民政府			实施单位	三川口镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	15	15	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.维修产业道路,方便人民群众生产发展和日常出行;2.加快发展农村产业道路,改善农村交通状况,提升生产能力,便民服务群众,保障群众利益。3.建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入。				1.维修产业道路,方便人民群众生产发展和日常出行;2.加快发展农村产业道路,改善农村交通状况,提升生产能力,便民服务群众,保障群众利益。3.建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产业道路长(米)	300	300	15	15	
			产业道路宽(米)	3.5	3.5	10	10	
			排水管道(米)	18	18	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数(万元)	15	15	10	10	
	时效指标	项目(工程)完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	改善产业发展条件	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	受益户数(≥户)	≥640	≥640	5	5	
		生态效益指标	带动农村产业发展	持续发展	持续发展	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	93%	10	8	满意度未达到预期	
总分						100	98	

# 三川口镇祥水沟村产业道路建设 2022 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况：

子巩衔组发〔2022〕11号，子财发〔2022〕183号文件实施项目。

#### 2. 项目建设内容：

建设生产道路 300 米，宽 3.5 米

### （二）项目目标

## 2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		三川口镇祥水沟村产业道路建设				
主管部门		三川口镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	15			
		其中：财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。			1. 维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	产业道路长（米）	300	300	
			产业道路宽（米）	3.5	3.5	
			排水管道（米）	18	18	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%		
成本指标	预算控制数（万元）	15	15			

效益指标	时效指标	项目（工程）完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
	可持续影响指标	改善产业发展条件	明显改善	明显改善	
	社会效益指标	受益户数（≥户）	≥640	≥640	
	生态效益指标	带动农村产业发展	持续发展	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	93%	满意度未达到预期

### 1. 总体目标：

1. 维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。

### 2. 年度目标：

1. 维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金，大祥水沟村产业道路建设项目总投入为15万元，资金已于2022年批复到位。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

截止2022年8月12日，祥水沟村产业道路建设项目资金15万元，项目资金15万元已经全部用于祥水沟村产业道路建设。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.6.21	一般公共预算	祥水沟村产业道路建设	7.5
1	2022.8.12	一般公共预算	祥水沟村产业道路建设	7.5
合 计				15

### 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

三川口镇人民政府祥水沟村产业道路建设已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。，满意度指标扣 2 分、得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237 号）。

### 四、存在问题与改进措施



（一）存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

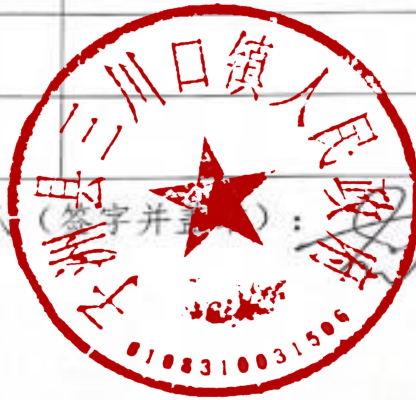
（二）改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	李小鸿	书记	子洲县三川口镇人民政府	
	纪波	镇长	子洲县三川口镇人民政府	
	李文莹	会计	子洲县三川口镇人民政府	李文莹

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：





2020年10月10日
