

周家硷镇董家仵崂村村集体经济
菌类培养改扩建项目

绩效评价报告

委托单位：子洲县财政预算绩效评价中心

评价机构：陕西企信锐达财税咨询管理有限公司

提交日期：2024年10月20日

目 录

绩效评价报告.....	1
一、 基本情况	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 校正绩效目标.....	4
二、 绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准.....	6
(三) 评价依据.....	8
(四) 绩效评价工作过程.....	9
三、 综合评价情况及评价结论	11
(一) 综合评价情况.....	11
(二) 评价结论.....	12
四、 绩效评价指标分析	14
(一) 项目决策情况.....	14
(二) 项目过程情况.....	18
(三) 项目产出情况.....	21
(四) 项目效益情况.....	22
五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析	24
(一) 主要经验及做法.....	24
(二) 存在的问题.....	24
六、 有关建议	25
七、 其他需要说明的问题	26
八、 附件	26
附件 1：周家砭镇董家仵崂村村集体经济菌类培养改扩项目资金绩效评价体系及得分表.....	27
附件 2：周家砭镇董家仵崂村村集体经济菌类培养改扩项目问卷调查表	33

周家砭镇董家砭村集体经济 菌类培养改扩项目

绩效评价报告

项目名称	周家砭镇董家砭村集体经济菌类培养改扩项目		
项目主管部门	子洲县农业农村局		
项目实施单位	周家砭镇人民政府		
支出项目起止时间	2024 年度		
投资总金额	500 万元		
其中：自筹资金		自有资金	0.00 万元
		信贷资金	
财政补助资金总额	500 万元	上级财政补助	500 万元
		县本级补助	00.00 万元
		区县配套金额	
实际到位金额	500 万元	项目实际支出金额	500 万元
项目概况	周家砭镇董家砭村集体经济菌类培养改扩项目，项目立项依据为《关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（子财发〔2024〕69 号），《关于下达 2024 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（子财发〔2024〕315 号），《子洲县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于下达 2024 年中央（提前）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（子巩衔组发〔2024〕6 号），《子洲县财政局关于对 2024 年涉农整合资金项目进行重点绩效评价的通知》（子财函〔2024〕132 号），项目预算金额 500 万元，实际下达 500 万元。		
项目绩效目标	资产归 3 个村集体，由第三方运营管护；持续推进村集体经济“削弱培强”，增加村集体收入，预计年收入 10 万元；吸纳临时就业 60 人。		
支出执行情况	周家砭镇董家砭村集体经济菌类培养改扩项目资金 500 万元，截至本次评价日，已支付资金 500 万元，资金支付率 100%。		
绩效评价结论	老君殿镇脱贫户及监测户产业帮扶项目综合评价得分为 90.5 分。根据《子洲县人民政府办公室关于印发子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》（子政办发【2021】27 号）项目得分级别划分标准，本项目总体评价结果为优秀。		

周家硷镇董家圪崂村村集体经济 菌类培养改扩项目

绩效评价报告

为全面检验周家硷镇董家圪崂村村集体经济菌类培养改扩项目资金的使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩【2020】9号）的有关规定和要求，子洲县财政预算绩效评价中心委托陕西企信锐达财税咨询管理有限公司，组织开展周家硷镇董家圪崂村村集体经济菌类培养改扩项目绩效评价工作。我们审核了子洲县农业农村局提供的相关资料，结合专家组的评审意见，形成了本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目概况

周家硷镇董家圪崂村村集体经济菌类培养改扩项目，该项目建设内容为厂房改扩建 10640 平米（菌棚 62 栋）2 吨全能王锅炉 1 台，保温棉 9500 平米，大棚专用压膜线 2000 米，风机 $\Phi 1100$

15 台，环流风机 30 台，外遮阳(含轻钢结构骨架、传动机构、遮阳网)20448 平米，62 栋棚更换电动卷膜器，100 米扭矩电动卷膜器(带爬升器)124 台，47 栋增加电动卷膜、水帘、风机降温系统，100 米扭矩电动卷膜器(带爬升器)47 台，爬升杆加固 47 套，风机 $\Phi 1380$ 94 台，装袋流水线 3.6 立方 2 台，灭菌包 5.5 米*4.8 米*2.8 米 6 套，灭菌架 0.8 米*1 米*2 米 5 套，3 吨生产叉车 1 台，939 生产铲车 1 台，冷库改造 3 个，电控柜(分八个区域控制)8 套，智控设备调试 1 项。总投资 574.73 万元，第一批下达 300 万元，第一批下达 200 万元。该项目为财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

2. 资金投入和使用情况

子洲县农业农村局收到周家硷镇董家屹崂村村集体经济菌类培养改扩项目资金 500 万元，截至本次评价日，资金支出金额 500 万元。

(二) 项目绩效目标

根据子洲县农业农村局申报的绩效目标，本项目的总体绩效目标为村集体帮扶资金注入伟烨创业种养殖专业合作社，资金确权至村集体，协议期满后资金收回财政；持续壮大村集体经济，村集体按照协议（按照注入资金的 5%）收益；提供就业岗位 4 个，人均年收入 4 万元；与周边农户不小于 20 户，签订土鸡蛋代销收购协议，增加周边农户收入；修建饲养棚 2 个面积 2640 平米，排污 40 米，铺设上下水 1.3 公里，储藏库 400 平米，

料库 200 平米，配套设备粉料机 1 台，输送机 1 台，投食机 1 台，通风设备 10 套，降温设备 10 套。具体指标如下：

1. 产出指标

(1) 数量指标

改造 62 个大棚。

(2) 质量指标

验收合格率 100%。

(3) 时效指标

任务完成及时率为 100%。

(4) 成本指标

预算控制金额 500 万元。

2. 效益指标

(1) 社会效益指标

通过项目的实施，通过项目的实施，为地区农村劳动力提供更多的就业机会。

(2) 经济效益指标

通过项目的实施，村集体收入增加。

(3) 受益对象满意度指标

受益项目涉及地群众满意度 $\geq 90\%$ 。

(三) 校正绩效目标

(1) 产出指标中的时效指标和成本指标编制不规范。时效指标应填制具体的开工时间和完工时间，不能填写任务完成及时

率为 100%。成本指标应填写具体的指标范围，不能只填预算控制金额 500 万元，如保温设施多少万元、提高质量多少万元等；

(2) 效益指标中的经济效益指标应填写具体能给农民带来多少收益,比如通过办厂能增加周边居民不低于 30 万元的收入,同时村集体经济按合同约定每年增加 25 万元等。社会效益指标应填写至少增加 24 个就业岗位, 实地评价发现可增加零时就业岗位 100 个左右等。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价, 衡量周家砣镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目资金绩效, 评价周家砣镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目资金使用是否达到预期目标, 资金管理是否规范, 资金使用是否有效, 并总结经验, 分析存在的问题, 有针对性地采取有效措施, 进一步改进和加强财政支出项目管理, 切实提高财政资金使用效益, 为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象是“周家砣镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目”, 共涉及资金 500 万元。本次评价主要以本项目内容为基础, 动态地对项目决策、过程、产出和效益四个方面进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

本次评价遵循目标导向性原则、科学客观性原则和公平公正性原则，评价组在开展本次绩效评价时遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家与项目承担单位无任何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

（8）保密原则。评价工作人员和评价专家对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩【2020】9号），财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10号）（以下简称“财预10号文”），《关于下达2013年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（子财发〔2023〕223号）的规定，评价组与子洲县财政预算绩效评价中心在原有申报年度预算支出绩效目标基础上，共同修改、设置、制定用于此次绩效评价的指标体系以及相应的评分细则；评价指标设置三级，其中一级指标4个，二级指标13个，三级指标23个（具体指标设置及评价标准详见附件1）。指标内容主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分100分。

3. 评价方法

本项目进行绩效评价时采用比较法、层次分析法、公众评判法、因素分析法等方法对周家硷镇董家圪崂村村集体经济菌类培养改扩项目的投入、产出和效益做出客观、公正的评价。

（1）比较法：通过比较项目实施产生的实际结果与预定目标，找出差异与不足，对项目的各项绩效目标进行分析与评价。

（2）层次分析法：结合政策文件，制定项目绩效评价指标体系，应用该体系进行评价。

(3) 公众评判法：通过开展较为广泛的公众问卷调查和抽样分析，对项目产生的效果进行评判，以评价绩效目标实现程度。

(4) 因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

本次评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为100分，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据子洲县人民政府办公室《关于印发子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》（子政办发【2021】27号），按照最终得分将绩效评价结果分为四个等级：

综合得分在70分以下为差；

综合得分在70-80分（含70分）为一般；

综合得分在80-89分（含80分）为良好；

综合得分在90-100分（含90分）为优秀。

（三）评价依据

1. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》。
2. 《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》。
3. 《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩【2020】9号）。
4. 财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10号）。

5. 《关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（子财发〔2024〕69 号）。

6. 《关于下达 2024 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（子财发〔2024〕315 号）。

7. 《子洲县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于下达 2024 年中央（提前）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（子巩衔组发〔2024〕6 号）。

8. 《子洲县财政局关于对 2024 年涉农整合资金项目进行重点绩效评价的通知》（子财函〔2024〕132 号）。

9. 《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理办法（试行）》

10. 资金拨付文件及相关资料。

11. 其他相关依据。

（四）绩效评价工作过程

评价组通过广泛收集项目资料并分析项目情况，采用查阅资料、深度访谈与问卷调查相结合的方法收集一手数据，通过对资料分析、研究、总结，运用对比法、逻辑分析法对项目评分，得出项目取得的成绩，指出项目存在的问题，提出相关建议。

2024 年 9 月初，评价组积极与项目单位联系，了解项目概况，包括项目的内容、管理制度、资金流程等，并对相关项目进行了走访调研，包括访谈负责人、数据材料收集等，于 10 月上旬完成了前期调研工作，明确了绩效评价目的、方法、思路、指标体

系、评价标准和社会调查方案等。10月下旬，评价组严格按照工作方案经历了数据采集、重点复核、问卷调查、社会访谈、数据分析和报告撰写环节，顺利完成了绩效评价工作。

本次财政资金绩效评价工作计划分为四个阶段：

1. 前期准备阶段

接受子洲县财政预算绩效评价中心委托后，为保证本次绩效评价工作顺利开展，充分把控项目风险及项目绩效管理相关工作成果和质量，我所与委托单位沟通落实绩效评价工作的具体要求；此外，我所内部召开绩效评价工作部署会议，成立绩效评价工作组，制定项目工作计划，对评价组成员提出任务、职业道德和保密工作要求。

项目评价组深入学习了财政支出绩效评价和项目管理方面的制度和政策，学习了项目评价指标体系和项目评价方案，并明确评价工作开展程序及阶段性要求，拟定了《周家砭镇董家砭村村集体经济菌类培养改扩项目资金绩效评价体系及得分表》。我公司在征求子洲县财政预算绩效评价中心意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善后，提交子洲县财政预算绩效评价中心。

2. 组织实施阶段

评价组按照绩效评价实施方案和绩效评价指标体系，组织赴项目单位调研，现场考察与收集初步资料，采集政策文件、操作办法、管理制度、项目的基本信息等，确定评价的方向和评价的

重点等内容；依据评价指标体系搜集项目业务、财务资料，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；对搜集的资料进行分类、整理，开展资金使用情况调查工作；加强与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会，撰写调研阶段的情况综合报告。

3. 实地核查

为保证绩效评价数据的真实、完整，此次评价对抽取项目进行实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证项目资料的真实性；另一方面对项目建设内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

4. 分析评价

按照制定的绩效评价指标体系，根据收集的资料、访谈与问卷调查等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。在前期资料收集、访谈、问卷调查、分析研究与归纳总结的基础上，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，组长负责报告的总纂；与项目单位沟通并修改完善后，形成正式的绩效评价报告，包括相关文本文件和附件；根据专家评审意见，进一步修改优化评价报告，并协助委托方和项目主管单位进行后续整改工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次绩效评价工作在绩效专家及行业专家的指导下，根据现场评价情况和资金使用单位自评材料，评价小组认为，周家砭镇董家仵崂村村集体经济菌类培养改扩项目，使基础设施和现代化

的物质装备得到改善，新品种、新技术等各种现代科技成果得以应用，项目区设施鲜食特色菌类经营管理水平、种植作业效率将得到很大提升等方面发挥了重要作用。但是项目管理不严格，未进行绩效自评，未提供相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段等问题。经综合评定，本项目资金的绩效评分为 90.5 分，绩效表现为优秀。

（二）评价结论

评价小组在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价的基础上，并结合子洲县农业农村局对项目的组织监督和管理情况，依据项目绩效评价指标体系进行评分，周家砭镇董家仵崂村村集体经济菌类培养改扩项目资金绩效评价综合得分为 90.5 分，评价等级为优秀。具体评分见下表：

表 1 周家砭镇董家仵崂村村集体经济菌类培养改扩项目资金指标评分表

项目	标准分值	评价得分	得分率
决策指标	27.00	23.00	85.19%
过程指标	23.00	17.93	77.96%
产出指标	25.00	25.00	100.00%
效益指标	25.00	25.00	100.00%
分数合计	100.00	90.93	90.93%

图 1 一级指标得分示意图

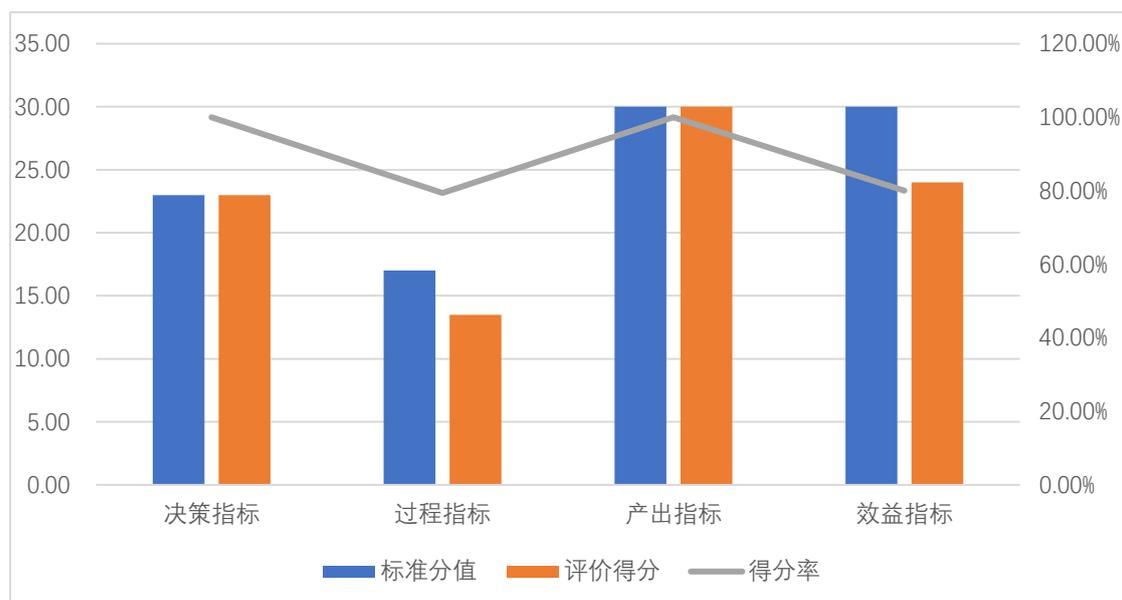


表 2 周家砭镇董家砭村集体经济菌类培养改扩项目资金指标评分表

项目	标准分值	评价得分	得分率
项目立项	8.00	8.00	100.00%
绩效目标	9.00	9.00	100.00%
资金投入	6.00	6.00	100.00%
资金管理	8.00	8.00	100.00%
组织实施	9.00	5.50	61.11%
数量指标	8.00	8.00	100.00%
质量指标	8.00	8.00	100.00%
时效指标	7.00	7.00	100.00%
成本指标	7.00	7.00	100.00%
经济效益	6.00	6.00	100.00%
社会效益	6.00	6.00	100.00%
可持续影响	12.00	6.00	50.00%
受益对象满意度	6.00	6.00	100.00%
得分合计	100.00	90.50	90.50%

图 2 二级指标得分示意图

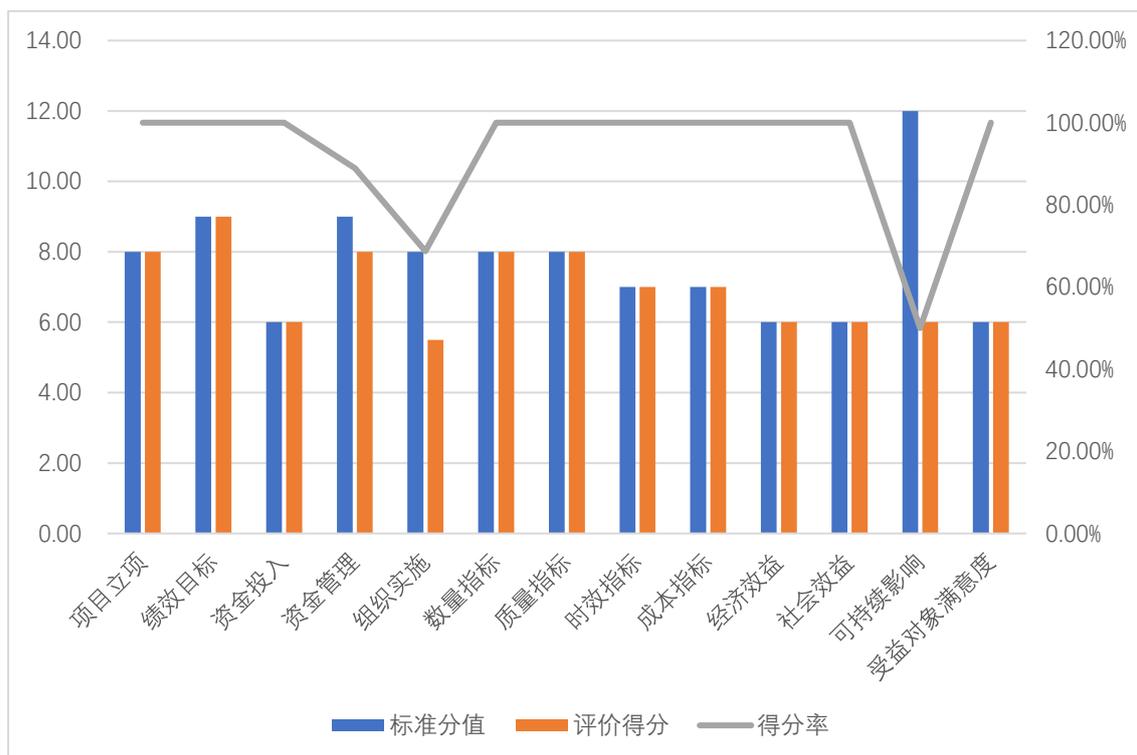


表 1、2 显示，在决策指标、过程指标、产出指标和效益指标四方面，决策指标和产出指标得分较高，反映出周家砭镇董家屹崂村村集体经济菌类培养改扩项目达到预期产出，效益指标和过程指标得分较低，反映出子洲县农业农村局项目管理制度和项目管理水平有待改进完善。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目决策指标主要包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面内容，共细化为 7 个三级指标，权重 23.00 分，本次评价得分 23.00 分，得分率为 100.00%，评分详细如下：

表 3 项目决策得分情况表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	得分率
决策指标	项目立项	8.00	8.00	100.00%
决策指标	绩效目标	9.00	9.00	100.00%
决策指标	资金投入	6.00	6.00	100.00%
合计		23.00	23.00	100.00%

1. 项目立项

该指标分值 8.00 分，本次评价得分 8.00 分。本指标主要从立项依据充分性和项目立项规范性两个方面进行评价。经评价，本项目立项依据充分，项目立项规范，该指标得 8.00 分。

表 4 项目立项得分情况表

二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	4.00	4.00	100.00%
项目立项	项目立项规范性	4.00	4.00	100.00%
合计		8.00	8.00	100.00%

(1) 立项依据充分性，该指标分值 4.00 分，本次评价得 4.00 分，主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。经查看项目资料，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责

任划分原则；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，该指标得 4.00 分。

(2)项目立项规范性,该指标分值 4.00 分,本次评价得 4.00 分,主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。经查看项目资设立过程符合相关要求,该指标得 4.00 分。

2. 绩效目标

该指标分值 9.00 分,本次评价得分 9.00 分。绩效目标从绩效目标合理性、绩效指标明确性和绩效指标全面性三个方面进行评价。经评价,本项目绩效指标设置较为合理,指标数量与计划数相符,该指标得 9.00 分。

表 5 绩效目标得分情况表

二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	得分率
绩效目标	绩效目标合理性	3.00	3.00	100.00%
绩效目标	绩效指标明确性	3.00	3.00	100.00%
绩效目标	绩效指标全面性	3.00	3.00	100.00%
合计		9.00	9.00	100.00%

(1)绩效目标合理性,该指标分值 3.00 分,本次评价得 3.00 分,主要考核项目所设定的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价组查看了本项目的绩效目标表,绩效目标设置基本合理,该

指标不扣分。

(2)绩效指标明确性,该指标分值 3.00 分,本次评价得 3.00 分,主要考核依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效指标的明细化情况。评价组查看了本项目的绩效目标表,设置清晰,该指标得 3.00 分。

(3)绩效指标全面性,该指标分值 3.00 分,本次评价得 3.00 分,主要考核依据绩效目标设置的绩效指标是否全面有效的反映绩效目标的实现情况。评价组查看了本项目的绩效目标表,本项目绩效目标中数量指标设置全面。该指标得 3.00 分。

3. 资金投入

该指标分值 6.00 分,本次评价得分 6.00 分。资金投入从预算编制科学性和资金分配合理性两个方面进行评价。经评价,本项目预算编制科学,资金分配合理。该指标综合得分 6.00 分。

表 6 资金投入得分情况表

二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	得分率
资金投入	预算编制科学性	3.00	3.00	100.00%
资金投入	资金分配合理性	3.00	3.00	100.00%
合计		6.00	6.00	100.00%

(1) 预算编制科学性

该指标分值 3.00 分,本次评价得 3.00 分,主要考核项目预算编制是否经过科学论证、标准是否明确,资金额度与年度目标

是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性和合理性情况。本项目预算编制科学，该指标得 3.00 分。

(2) 资金分配合理性

该指标分值 3.00 分，本次评价得 3.00 分，主要考核项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性和合理性情况。本项目未见资金分配合理，该指标得 3.00 分。

(二) 项目过程情况

项目过程指标主要包括资金管理和组织实施两方面内容，共细化为 7 个三级指标，权重分 17.00 分，本次评价得分 13.50 分，得分率为 79.41%，评分详细如下：

表 7 项目过程得分情况表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	得分率
过程指标	资金管理	8.00	8.00	100.00%
过程指标	组织实施	9.00	5.50	61.11%
合计		17.00	13.50	79.41%

1. 资金管理

该指标分值 8.00 分，本次评价得分 8.00 分。资金管理从资金到位率、资金到位及时率、预算执行率和资金使用合规性四个方面进行评价。经评价，本项目资金及时全部到位，资金使用符合相关规定，具体评分如下：

表8 资金管理得分情况表

二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	得分率
资金管理	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
资金管理	资金到位及时率	2.00	2.00	100.00%
资金管理	预算执行率	2.00	2.00	100.00%
资金管理	资金使用合规性	2.00	2.00	100.00%
合计		8.00	8.00	100.00%

(1) 资金到位率

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目实际到位资金与计划应投入资金的比率，用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。经检查相关资料，本项目资金全部到位，该指标得 2.00 分。

(2) 资金到位及时率

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目到位资金的及时性，用以反映财政或项目主管部门对资金落实的及时性程度。经检查相关资料，周家砭镇董家仵崂村村集体经济菌类培养改扩项目预算批复 500 万元，资金已全部及时到位，该指标得 2.00 分。

(3) 预算执行率

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映项目预算执行情况。经检查相关资料，子洲县农业农村局收到周家砭镇董家仵崂村村集体经济菌类培养改扩项目资金 500 万元，截至本次评价日，已支付资

金 500 万元，资金支付率 100%，该指标得 2.00 分。

(4) 资金使用合规性

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分。主要考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映项目资金的规范运行情况。经检查相关资料，本项目实施单位资金使用合规，该指标得 2.00 分。

2. 组织实施

该指标分值 9.00 分，本次评价得分 5.50 分。组织实施从管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性三个方面进行评价。经评价，本项目未提供绩效自评报告，此外，项目未制定相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，该指标综合得 5.50 分。

表 9 组织实施得分情况表

二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	得分率
组织实施	管理制度健全性	3.00	2.00	66.67%
组织实施	制度执行有效性	3.00	2.00	66.67%
组织实施	项目质量可控性	3.00	1.50	50.00%
合计		9.00	5.50	61.11%

(1) 管理制度健全性

该指标分值 3.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。经检查相关资料，本项目未

提供绩效自评报告，该指标扣 1.00 分，得 2.00 分。

(2) 制度执行有效性

该指标分值 3.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目实施是否符合相关管理制度规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。经检查相关资料，本项目未提供验收报告，该指标扣 1.00 分，得 2.00 分。

(3) 项目质量可控性

该指标分值 3.00 分，本次评价得 1.50 分，主要考核项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。经检查相关资料，子洲县农业农村局未提供相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，该指标得 1.50 分。

(三) 项目产出情况

项目产出指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四方面内容，共细化 4 个三级指标，权重分 30.00 分，本次评价得分 30.00 分，得分率为 100.00%，评分详细如下：

表 10 项目产出得分情况表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	得分率
产出指标	数量指标	8.00	8.00	100.00%
产出指标	质量指标	8.00	8.00	100.00%
产出指标	时效指标	7.00	7.00	100.00%
产出指标	成本指标	7.00	7.00	100.00%
合计		30.00	30.00	100.00%

1. 数量指标

该指标分值 8.00 分，本次评价得分 8.00 分。该指标用以考核周家砭镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目任务的完成情况。经查看资料，本项目于 2024 年 9 月底全部完成，该指标得 8.00 分。

2. 质量指标

该指标分值 8.00 分，本次评价得分 8.00 分。本指标用以反映和考核周家砭镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目的质量是否合格，是否符合国家规定的标准。经查看资料，本项目验收合格，该指标得 8.00 分。

3. 时效指标

该指标分值 7.00 分，本次评价得分 7.00 分。本指标主要考核项目单位是否按计划和要求完成任务。周家砭镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目于 2023 年 9 月底，任务完成及时率为 100%。

4. 成本指标

该指标分值 7.00 分，本次评价得分 7.00 分。本指标用以反映和考核项目支出是否控制在预算范围内。经检查相关资料，周家砭镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目已签订的合同金额未超过预算金额，该指标得 7.00 分。

（四）项目效益情况

项目效益包括项目所产生的经济效益、社会效益、可持续影

响和受益对象满意度四个方面。共细化为 6 个三级指标，权重分 30.00 分，评价得分 24.00 分，得分率为 80.00%，评分详细如下：

表 11 项目效益得分情况表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	得分率
效益指标	经济效益	6.00	6.00	100.00%
效益指标	社会效益	6.00	6.00	100.00%
效益指标	可持续影响	12.00	6.00	50.00%
效益指标	受益对象满意度	6.00	6.00	100.00%
合计		30.00	24.00	80.00%

1. 经济效益

该指标分值 6.00 分，本次评价得分 6.00 分。经济效益考核项目建设后，村集体经济收入增收的情况。通过实地调查和村民调查问卷分析，项目周边农户认可项目实施后增加了村集体经济收入，人均增加 2 万元以上，得 6.00 分。

2. 社会效益

该指标分值 6.00 分，本次评价得分 6.00 分。社会效益从通过项目的实施，是否新增了就业岗位。通过实地调查，项目实施后增加了 100 多个就业岗位，得 6.00 分。

3. 可持续影响

该指标分值 12.00 分，本次评价得分 6.00 分。可持续影响从改善村民生活水平和管护主体责任落实两方面进行评价，经检查相关资料，通过实地调查和村民调查问卷分析，项目实施后改善了村民生活条件，但是没有落实管护主体责任，该指标得 6.00

分。

4. 受益对象满意度

该指标分值 6.00 分，本次评价得分 6.00 分。本指标从项目涉及地群众的满意度方面进行评价。经过对问卷结果的统计，项目涉及地群众对本项目的满意度在 90%以上，该指标得 6.00 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

乡村振兴，产业是基础。子洲县周家砭镇把发展特色产业作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重点产业项目来抓，结合自身资源禀赋，创新产业发展模式，发展食用菌特色种植，引入调湿和通风机组等设备，采取“公司+家庭农场+农民”的运营模式，规模化生产滑子菇，助力乡村振兴。

（二）存在的问题

1. 绩效评价意识薄弱，绩效管理水平有待于进一步提高
绩效目标设定不够细化。绩效目标方面：有该项目的时效指标设置不具体，不能清楚反映项目的时效情况；成本指标细化不到位，体现不出资金的流向和实际支持情况等；效益指标定性较多，没有可控性。你单位设绩效目标监控和项目绩效自评工作中，几乎没有开展，不能很好地监控和评价资金的流向和发挥的效益，更不能监管资金是否按原定的绩效目标实现。

2. 项目实施不规范，项目内控不健全

本项目制度建设不够健全，未提供相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段资料，验收报告；未完工未办理移交手续，与项目管护单位签署管护协议，且没有制定明确的管护实施方案和落实管护资金。项目支付不严谨，你镇没有对完工项目进行验收就将资金支付完成。

六、有关建议

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）、《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发〔2019〕73号）、《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发〔2020〕11号）、《子洲县财政支出事前绩效评估管理办法》（子财发〔2022〕204号）等文件精神。为优化财政资源配置、提升公共产品和公共服务水平，将事前绩效目标编制、事前绩效评估、绩效监控、绩效自价等绩效管理理念和管理方法贯穿于项目工作的全过程。建议周家硷镇人民政府做到以下工作要求：

1. 应根据《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理办法（试行）》和《子洲县财政支出事前绩效评估管理办法》办法规定，对新增项目（或经费）应在确定项目时充分开展事前绩效评价工作，项目竣工后，应及时开展自评工作，并且及时验收项目。

2. 绩效监控必须要深入到现场，精准对照调整后的绩效目标表分别进行监控。

3. 完善相关管理制度，做到项目实施有据可循

尽快根据工程实际情况制定未提供相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，指导项目实施，管理制度应细化，明确项目的建设内容和支出范围、项目建设程序和验收标准等方面的内容；

4. 加强项目后监管，完善长效管护机制。建立项目建设后的长效管护机制，办理移交手续，与项目管护单位签署管护协议，制定明确的管护实施方案，落实管护资金，健全资金保障机制。

七、其他需要说明的问题

本次评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

八、附件

1. 周家砣镇董家仵崂村村集体经济菌类培养改扩项目资金绩效评价体系及得分表

2. 周家砣镇董家仵崂村村集体经济菌类培养改扩项目问卷调查表

附件 1：周家砣镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目资金绩效评价体系及得分表

周家砣镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目绩效评价体系及得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
1	决策（23分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	4.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1.00分）； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1.00分）； ③项目是否属于乡村振兴补助资金项目支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1.00分）； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（1.00分）。	4.00	
2			项目立项规范性	4.00	项目的申请,设立过程是否符合相关要求,用以考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（2.00分）； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求（1.00分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1.00分）。	4.00	
3		绩效目标（9分）	绩效目标合理性	3.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否设置了绩效目标（1.00分）； ②绩效目标是否与周家砣镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目有相关性（1.00分）； ③项目预期产出效益和效果是否不低于立项文件要求的最低要求（1.00分）。	3.00	

周家砭镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目绩效评价体系及得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
						注：若①不满足得分标准，则该项指标得0分。		
4			绩效指标明确性	3.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且与目标任务数符合（1.50分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.50分）。	3.00	
5			绩效指标全面性	3.00	依据绩效目标设置的绩效指标是否全面有效的反映绩效目标实现情况。	评价要点： ①绩效指标是否全面、有效地反映绩效目标（1.50分）； ②绩效指标设置是否存在避重就轻或指标值不合理的情况（1.50分）。	3.00	
6		资金投入 (6分)	预算编制科学性	3.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1.50分）； ②预算确定的资金额是否与工作任务相匹配（1.50分）。	3.00	
7			资金分配合理性	3.00	项目预算资金分配是否有测算依据,与地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1.50分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.50分）。	3.00	

周家砭镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目绩效评价体系及得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
8	过程(17分)	资金管理(8分)	资金到位率	2.00	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点: ①资金到位率 100 分,且按规定时间及时到位,得 2 分; ②其他情况,在按满分乘以到位率计算得分的基础上,综合考虑未全额到位、未及时到位的原因等因素核定最后得分。	2.00	
9			到位及时率	2.00	是否及时到位,若未及时到位,是否影响项目进度。	评价要点: 资金到位及时率=(实际已及时到位资金/应到位资金)×100%。 ①到位及时率≤100%,且未对项目开展造成不良影响,得分为:指标分值×到位及时率; ②到位及时率<100%,且对项目开展造成不良影响,得分为 0。	2.00	
10			预算执行率	2.00	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点: 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 =100%得 2 分,未达到 100%的按比例得分,超过 100%的,每超过 10 个百分点,扣 0.01 分,扣完为止。	2.00	

周家砭镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目绩效评价体系及得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
11			资金使用合规性	2.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.50分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.50分); ③是否符合项目预算批复规定的用途(0.50分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(0.50分)。	2.00	
12		组织实施 (9分)	管理制度健全性	3.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分); ③项目绩效自评组织情况(1分)。	2.00	未提供绩效自评报告,扣1分。
13	制度执行有效性		3.00	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分); ③项目合同书、验收报告、政府采购等资料是否齐全并及时归档(1分)。	2.00	未提供验收报告	
14	项目质量可控性		3.00	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(1.50分); ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段(1.50分)。	1.50	未提供相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	

周家砭镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目绩效评价体系及得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
15	项目产出 (30分)	数量指标 (8分)	改造大棚 (个)	8.00	用以考核周家砭镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目任务的完成情况。	评价要点： 评价组获取项目实施计划、项目文件、项目验收书。完成预算指标 50 个得满分，未全部完成按照完成程度百分比得分，未完成不得分。	8.00	
16		质量指标 (8分)	验收合格率	8.00	用以考核周家砭镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目是否符合验收标准。	评价要点： 评价组获取项目实施计划、项目文件、项目验收书，并进行现场查看，完成得满分，未完成不得分。	8.00	
17		时效指标 (7分)	任务完成 及时性	7.00	用以考核项目建设任务按计划批复规定时间完成情况。	评价要点： 按照实施方案或者项目立项文件，是否能按计划和要求完成任务。全部完成得满分，未全部完成按照完成程度百分比得分，未完成不得分。	7.00	
18		成本指标 (7分)	实际投资 额	7.00	用以考核项目支出是否控制在预算金额范围内。	评价要点： 以项目立项文件中财政资金为标准，实际支出低于等于预算金额得满分；超过预算金额的，不得分。	7.00	
19	项目效益 (30分)	经济效益 (6分)	增加村集体 经济收入	6.00	用以考核项目建设后，是否可增加村集体经济收入。	评价要点： 通过走访和问卷调查，现场访谈并实地查看养殖情况。认为周家砭镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目增加了村集体经济收入的农民比例达受访者总数的 90%以上得满分，其余根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。	6.00	

周家砭镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目绩效评价体系及得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
20		社会效益 (6分)	新增就业岗位	6.00	通过项目的实施,是否为地区农村劳动力提供更多的就业机会。	评价要点: 通过项目实施,是否提供了更多的就业岗位,若建设任务未完成,则按照完成的比例乘以基础分值得分。	6.00	
21		可持续影响 (12分)	改善村民生活水平	6.00	用以考核项目建设后,是否可改善当地村民生活水平。	评价要点: 通过村民调查问卷分析,认为周家砭镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目改善村民生活条件的村民达受访群众比例在90%(含90%)以上的得满分,其余根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。	6.00	
22	管护主体责任落实		6.00	项目竣工验收后,办理移交手续,与项目管护单位签署管护协议,且制定明确的管护实施方案,落实管护资金。	评价要点: ①项目管护方案或工程移交手续中是否有关管护内容的合理性和管护责任人的落实情况(2.00分); ②是否有具体的管护制度,明确资金来源(2.00分)。	0.00	未见相应的移交手续及管护实施方案	
23	受益对象满意度 (6分)		项目涉及地群众满意度	6.00	项目建设后,项目涉及地群众对项目建设的满意程度。	评价要点: 通过走访或问卷调查,分析项目涉及地群众对对子洲县周家砭镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目的总体满意程度。调查人员为项目区成年人。当调查满意的人数占调查总人数的比值超过90%时得满分,其余根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。	6.00	
合计		100.00	100.00	100.00			90.50	

附件 2：周家硷镇董家吃崂村村集体经济菌类培养改扩项目问卷调查表

问卷调查

<p>各位居民：您好！感谢您对陕西企信锐达财税咨询管理有限公司组织的本次问卷调查工作的支持与参与！为了了解到周家硷镇董家吃崂村村集体经济菌类培育改扩建设项目的实施效果，我们开展了此次问卷调查，对耽搁您的宝贵时间，我们再次表示衷心的感谢，谢谢您的合作！</p>		
1	您的工作岗位是？	<input type="checkbox"/> 普通村民 <input type="checkbox"/> 村委会成员 <input type="checkbox"/> 其他
2	您是否为周家硷镇董家吃崂村村民？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	周家硷镇董家吃崂村村集体经济菌类培育改扩建设项目实施后，是否促进了生态农业的发展，为乡村振兴注入了新的动能？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	周家硷镇董家吃崂村村集体经济菌类培育改扩建设项目实施后，是否推动了农业产业链延伸和乡村新业态发展？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	周家硷镇董家吃崂村村集体经济菌类培育改扩建设项目实施后，是否增加集体经济收入？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6	周家硷镇董家吃崂村村集体经济菌类培育改扩建设项目实施后，是否增加了工作岗位，带动了村民就业问题？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7	周家硷镇董家吃崂村村集体经济菌类培育改扩建设项目实施后，是否提升农民收入？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8	周家硷镇董家吃崂村村集体经济菌类培育改扩建设项目实施后，是否增强贫困群众自我发展能力？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9	周家硷镇董家吃崂村村集体经济菌类培育改扩建设项目实施后，是否带动了周边经济发展？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10	对周家硷镇董家吃崂村村集体经济菌类培育改扩建设项目总体满意度？	<input type="checkbox"/> 90%以上 <input type="checkbox"/> 80-90% <input type="checkbox"/> 70%-80% <input type="checkbox"/> 60%-70% <input type="checkbox"/> 60%以下
