

子洲县公安局治安监控“一线两闭环” 项目资金绩效评价报告

委托单位：子洲县财政预算绩效评价中心

评价单位：子洲县公安局

评价机构：陕西政诚汇鑫财税咨询有限公司

目录

一、项目基本情况	1
（一）立项依据	1
（二）基本内容	2
（三）组织管理	2
（四）项目资金情况	5
（五）项目绩效目标	6
二、评价实施情况	7
（一）评价标准	7
（二）绩效评价实施过程	11
三、评价结论与分析	11
（一）评分与评级	11
（二）评价结果	12
（三）绩效分析	12
四、项目效益	28
（一）有效化解社会矛盾、保障人民群众生命财产安全	28
（二）提升公安队伍信息化服务能力、工作效率	29
五、存在的问题	29
（一）项目实施过程不规范	29
（二）绩效管理意识薄弱	29
六、相关建议	30
（一）规范和加强项目管理	30

(二) 增强绩效管理意识	30
七、其他说明	30

项目名称	子洲县公安局 治安监控“一线 两闭环”项目	评价资金规模	360
主管部门	子洲县公安局	实际支出	333.95
实施单位	子洲县公安局	预算执行率	92.76%
评价单位	陕西政诚汇鑫财税咨询有限公司		
评价分数	90.23	评价等级	优
综合评价结果： 绩效评价小组根据项目主管部门及实施单位提供的资料，经过现场调研、数据收集和分析，对评价指标进行评分汇总，本次绩效评价最终得分为“90.23”，评级结果为“优”。			
主要绩效与经验： （一）有效化解社会矛盾、保障人民群众生命财产安全 （二）提升公安队伍信息化服务能力和工作效率			
存在主要问题： （一）项目实施过程不规范 （二）绩效管理意识薄弱			
意见建议： （一）规范和加强项目管理 （二）增强绩效管理意识			

为贯彻落实推进预算绩效管理工作的要求，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，提升公共服务质量，陕西政诚汇鑫财税咨询有限公司接受子洲县财政局的委托，承担子洲县公安局实施的2022年度子洲县治安监控“一线两闭环”项目绩效评价工作。为保证绩效评价的规范性、公正性、客观性和时效性，根据《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子政办发〔2021〕27号）等文件的相关要求，从决策、过程、产出和效益四个维度对项目进行综合评价。经第三方评价机构专家组审阅资料、现场核查、讨论及合议等工作流程后，形成本绩效评价报告。具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）立项依据

子洲县位于陕北黄土高原丘陵沟壑区腹地，榆林市南缘。县域面积2042平方公里，辖11镇、1乡、1个街道办事处、279个行政村，总人口30.25万。

子洲县公安局按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强社会治安防控体系建设的意见〉的通知》（中办发〔2014〕69号）《陕西省关于加快公共安全视频监控建设联网应用项目建设的实施意见》（陕办发〔2018〕46号）等相关文件精神，开展子洲县公安局治安监控“一线两闭环”建设项目，提高子洲县域治安防控水平、增强城市管理，有效解决现有监控系统老化，进一步推进子洲县立体化社会治

安防控建设，营造和谐稳定的社会治安环境，围绕维护县域稳定、打击违法犯罪和服务智慧城市发展三项任务，深化平安子洲、智慧子洲建设，有效提升子洲县社会治安防控、基层治理整体水平。

（二）基本内容

本次项目建设主要分为：子洲县内外两层防控圈卡扣点位及中心城市人像抓拍点位建设。

基本建设情况

序号	建设内容	数量
1	新立杆	36套
2	前端设备	70套
3	微卡口	37套
4	双向一体智能摄像机	7套
5	全景抢球	10套
6	全景人脸	1套
7	治安监控枪机	8套
8	智能双舱	7套
9	侦码仪器	3套
10	车载侦测仪	3套
11	移动布控球	1套
12	建设管理、分析和储存系统	1套

（三）组织管理

1.项目实施机构和职责

1) 项目建设单位：子洲县公安局，子洲县公安局为正科级建制，内设所队室26个，政工监督室、纪检监察室指挥

中心、办公室、警务保障室、国内安全保卫大队、治安管理局、刑侦大队、禁毒大队、法制大队、巡特警大队、食品药品侦查大队、交通管理局、看守所等15个局机关内设机构均为正科级建制和11个派出所。

2) 项目实施机构职责:

(1) 按照批复要求,组织制定建设实施方案、实施计划;

(2) 组织相关人员,进行本项目的设备采购,系统设计、开发、试运行等工作;

(3) 阶段性检查建设进度,协调解决建设实施中遇到的问题;

(4) 组织提出项目建成后的运行与管理机制的建议;

(5) 对任务目标、进度、财务、风险等各方面进行监控和评估。

2.计划实施进度:本项目建设周期4个月,从2022年6月至2022年9月,建设项目实施计划进度如下:

序号	进度	时间
1	工程初设代可行性研究报告阶段	2022年6月
2	工程施工招标阶段	2022年7月
3	工程建设阶段	2022年7月至9月
4	竣工验收阶段	2022年10月
5	工程投入使用	2022年11月

3.组织保障措施

1) 组织领导：子洲县公安局成立治安监控“一线两闭环”项目领导小组，由政委担任组长，副局长任副组长；大数据智能应用中心、指挥中心、警务保障室和纪检监察室为成员。

2) 建设原则：坚持标准建设、统筹规划、规范应用、分级保障、安全可控。依据国家相关法律法规、政策和技术标准，使用安全可控的软件和硬件，选择有效、有成果、高效的技术和产品。

4.成本测算

1) 成本预测：运用以往经验和价值工程对施工以前成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计，在满足系统实际使用要求的前提下，选择一套最佳成本方案，本项目以设备采购为主，在项目初期，充分调研了市场价格，按照行业标准预估项目成本。

2) 成本控制：在工程项目实施过程中，纠正成本偏差，使用费支出和消耗控制在计划之内。

(1) 施工前期的成本控制：工程投标阶段进行成本预测，中标以后确定成本目标。施工准备阶段运用价值工程，制定施工方案。对施工方法、组织形式、设备选型、技术措施等进行分析，编制成本计划，分解落实。

(2) 施工期间的成本控制：运用挣值理论计算分析施

工期间的实际成本和计划成本之间产生的差异及其原因，并采用有效的纠错措施。实行责任成本管理。

(3) 竣工验收阶段的成本控制：做好工程的竣工验收，保证施工任务单和限额领料单的结算准确。缩短竣工结尾时间，避免因项目拖延增加费用支出。

3) 项目质量的严格把关。保质保量地完成项目，才能从根本上把控项目成本问题，选用国内主流一线产品。而且整体投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。

(四) 项目资金情况

2022年子洲县财政局下达子洲县公安局治安监控“一线两闭环”项目资金360万元，共支付333.9505万元，结余26.0495万元（质保金）。

资金下达文件

单位：万元

序号	资金文件内容	预算下达文号	分配金额
1	子洲县财政局《关于下达2022年部门预算经费的通知》	(子财发〔2022〕11号)	280.00
2	子洲县财政局《关于下达2022年部门预算经费的通知》	(子财发〔2022〕258号)	80.00

2022年子洲县治安监控“一线两闭环”项目支付明细表

单位：万元

序号	日期	凭证字号	摘要	金额
1	2022-9-30	JZ-09-0061	建设采购	139.8364

2	2022-12-18	JZ-12-0095	项目监理费	3.3
3	2022-12-18	JZ-12-0096	治安监控项目费用	104.8773
4	2022-12-31	JZ-12-0218	采购项目费用	85.9368
合计				333.9505

（五）项目绩效目标

年度目标：建设横贯子洲县307国道、县城县域内外两级防控圈及城区主要部位的感知能力，实现精准防范、出入防控、动态监管、立体追溯等多要素管控，全面提升对各类风险隐患的自动识别、敏锐感知和预测预警预防能力。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效目标	产出指标	数量指标	新立杆	36套
			各类前端设备	70套
			侦码仪器	3套
			车载侦测仪	3套
			移动布控球	1套
			后台管理、分析及储存系统	1套
			微卡口	37套
			双向一体智能摄像机	7套
			治安监控枪机	8套
			智能双舱	7套
		质量指标	设备合格率	≥95%
			验收合格率	100%
		时效指标	项目竣工期限	2022年12月30日
		成本指标	项目工程费用	350.90万元
			其他费用	2.5万元

			监理费用	6.6万元
	效益指标	社会效益	提升公安机关信息化服务能力	提升
			提高公安队伍工作效率	提高20%
			有效化解社会矛盾	及时化解
		可持续影响	持续排除县域内外安全隐患	实时监控
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%
			人民群众满意度	≥95%

二、评价实施情况

（一）评价标准

1.评价目的

了解项目资金使用情况、项目管理状况、项目产出和项目实现效益，评价项目计划的落实和执行情况、绩效目标的实现情况，总结项目建设经验、发现相关问题并提出建议。

本次绩效评价的重点：按照预算绩效管理办法，评价项目申报、资金使用、项目监督管理、项目验收等资金使用和项目管理的规范性和执行有效性。

2.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日第二次修正）；

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》

的通知（财预〔2020〕10号）；

（4）《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）；

（5）《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）；

（6）《子洲县财政局关于开展2021年度重点项目绩效评价工作的通知》（子财发〔2022〕265号）；

（7）《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发〔2019〕73号）；

（8）《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发〔2020〕11号）；

（9）《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子政办发〔2021〕27号）。

（10）其他有关预算管理制度、资金及财务管理办法。

3.评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。评价指标体系和评价标准设计科学，评价过程体现民主和透明，考评人员能客观公正地做出评价。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（4）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

4.评价方法

绩效评价方法选用坚持简便有效原则，通过文件资料研究、成本效益分析法、现场和非现场相结合、数据统计分析等方法对项目实施及效益情况进行定量评价与定性评价。

◆案卷查阅法

评价小组通过收集资料并查阅子洲县公安局一线两闭环项目资金文件、项目立项文件、实施方案、业务管理制度、绩效管理制度、验收报告、合同计划书、（社会、生态、经济）效益以及社会群众满意度等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，对指标进行评价。

◆成本效益分析法

投入、过程、产出与效益进行对比分析，以评价项目绩效目标的实现程度。

◆数据核对法

将管理部门批复的绩效目标与项目单位提交的数据支撑材料进行核对，如将项目明细账、会计凭证等财务凭证与相应的项目支出金额进行核对，以核实相关数据的准确性和财务管理的合规性。对预算部门提供的实施方案、预算申报文本、绩效目标申报表中涉及的数量部分与项目单位提交的数据支撑材料进行核对，如将各类具体工作完成数量与产出数量进行核对，以核实项目产出的及时性和项目管理的有效性。

◆数据统计分析法

对调查问卷收集到的信息进行统计，并对统计数据进行分析，以得出服务对象满意度的结论。

◆问卷调查

受益群众对项目实施满意度，反馈对于本次评价工作具有重要意义。为了更加客观、全面地评价项目整体实施效益，评价工作组针对受益社会公众，根据项目内容设计调查问题，了解其对项目工作内容和服务效益的意见和建议，利用问卷调查结果综合评价和反映预算项目提供的服务内容与现实需求是否相符。

5.评价指标体系

本次绩效评价指标体系设定与权重分配采用逻辑框架法（LFA）和层次分析法（AHP）相结合的方法进行构建。

项目指标体系一级指标为4个层次：一级指标包括投入、过程、产出、效益；二级指标包括：项目立项、绩效目标、资金投入、事前绩效评估、项目管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响及满意度共13个指标。（详见附件（一））

（二）绩效评价实施过程

本次绩效评价工作得到了子洲县财政局的高度重视和大力支持，绩效评价小组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读项目文件资料、综合评价项目的实施情况，对产出和效益进行客观分析，按照工作方案设定的评分体系和评分标准对各项指标进行量化评分。具体实施过程如下：

绩效评价小组同子洲县公安局收集项目资金拨付的相关资料、政策文件、绩效目标表、绩效自评、资金使用明细表、合同书、决算书、预算批复文件等相关资料，并对上述资料进行深入研究和客观分析。

绩效评价小组对收集到的资料和问卷调查采集到的数据进行客观分析，综合评价项目的实施情况和产出效益，按照设定的评分体系和评分标准对各项指标进行量化评分，完成绩效评价报告。

三、评价结论与分析

（一）评分与评级

根据《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子

政办发〔2021〕27号），本次绩效评价等级分为：优、良、中、差四个等级次，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。分值 ≥ 90 为优、 $80 \leq \text{分值} < 90$ 为良、 $70 \leq \text{分值} < 80$ 为中、分值 < 70 为差。

（二）评价结果

绩效评价小组根据项目主管部门及实施单位提供的资料，经过现场调研、数据收集和分析，对评价指标进行评分汇总，本次绩效评价最终得分为“90.23”，评级结果为“优”。具体绩效评价指标得分结果如下：

项目绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
TR投入	18	15.5	86.11%
GC过程	20	18	90%
CC产出	30	26	86.67%
XY效益	32	30.73	96.03%
合计	100	90.23	90.23%

（三）绩效分析

1.投入情况分析

该指标主要考核项目投入，包括：项目立项、绩效目标、资金投入和事前绩效评估等方面，包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制合理性、资金分配合规性和事前绩效评估等7个三级指标，指标分值18分，投入评价得15.5分，得分率为86.11%。

投入情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	比例
TR投入 (18分)	TR01项目立项（6分）	TR11项目立项依据充分性	3	3	100%
		TR12项目立项程序规范性	3	3	100%
	TR02绩效目标（6分）	TR21绩效目标合理性	3	1	33.33%
		TR22绩效目标明确性	3	2.5	83.33%
	TR03资金投入（4分）	TR31预算编制合理性	2	2	100%
		TR32资金分配合规性	2	2	100%
	TR04事前绩效评估（2）	TR41事前绩效评估	2	2	100%
	小计		18	15.5	86.11%

TR11项目立项依据充分性：权重为3分，实际得3分。

子洲县公安局根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强社会治安防控体系建设的意见〉的通知》（中办发〔2014〕69号）《陕西省关于加快公共安全视频监控建设联网应用项目建设的实施意见》（陕办发〔2018〕46号）等相关文件精神，开展子洲县公安局治安监控“一线两闭环”建设项目，提高子洲县域治安防控水平、增强城市管理，有效解决现有监控系统老化，进一步推进子洲县立体化社会治安防控建设，营造和谐稳定的社会治安环境，围绕维护县域稳定、打击违法犯罪和服务智慧城市发展三项任务，深化平安子洲、智慧子洲建设，有效提升子洲县社会治安防控、基

层治理整体水平。综上所述，该项目立项依据充分，与部门的职责范围相符。根据评分标准，该指标得100%权重，即3分。

立项相关文件

序号	名称	文件号
1	《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于加强社会治安防控体系建设的意见>的通知》	（中办发〔2014〕69号）
2	《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》	（发改高技〔2014〕69号）
3	《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》	
4	《加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案	（发改办高技〔2014〕2056号）
5	《陕西省关于加快公共安全视频监控建设联网应用项目建设的实施意见》	《陕办字〔2018〕46号》
6	《陕西省公共安全视频监控建设联网应用工作总体方案》	2015-2020年
7	《陕西省公共安全视频监控联网系统工程技术规范》	（DB61/T 1143-2018）
8	《榆林市“雪亮工程”建设规范提升工程实施方案》	《榆办字〔2018〕62号》
9	子洲县公安局“一线两闭环”项目会议	2022.5.31

TR12项目立项程序规范性：权重为3分，实际得3分。

“一线两闭环”项目通过召开项目立项会议、制定项目绩效目标、开展项目事前绩效评估、制定项目实施方案等程序，申请、审批等均按照规定进行，审批文件符合相关要求。根据评分标准，该指标得100%权重，即3分。

TR21绩效目标合理性：权重为3分，实际得1分。

该资金绩效目标由县公安局根据进行编制，绩效目标的设立符合客观实际，绩效目标中产出和效益指标符合部门发展规划，绩效目标表中指标与指标内容相对应。存在的问题：绩效指标部分不合理，三级指标（数量指标、社会效益）未细化。根据评分标准，该指标得33.33%权重分，即1分。

TR22绩效目标明确性：权重为3分，实际得2.5分。

子洲县治安监控“一线两闭环”项目绩效目标表社会效益的三级指标未明确指标值（详见附件）。根据评分标准，该指标得83.33%权重分，即2.5分。

TR31预算编制合理性：权重分为2分，实际得2分。

资金下达文件

序号	摘要	金额
1	子洲县财政局《关于下达2022年部门预算经费的通知》（子财发〔2022〕11号）	2800000
2	《关于预下达专项经费的通知》（子财发〔2022〕258号）	800000

一线两闭环建设项目预算表

序号	名称	计算基数	金额：元
一	工程费用		3509943.00
2	前端设备		1429733.00
3	平台设备		1296210.00
4	电子采集设备		784000.00
二	工程建设其他费用		90000.00
1	工程建设其他费用	取费标准来源于	52000.00

		《GA_T70-2014》 标准	
2	建设单位管理费	取费标准来源于 《GA_T70-2014》 标准	38000.00
三	建设项目总投资	工程费用+工程建 设其他费用	3599943.00

该项目资金预算编制符合行业标准，预算编制科学合理。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。

TR32资金分配合规性：权重分为2分，实际得2分。

该项目资金分配符合国家财政法规和财务制度等资金管理办法，资金拨付有完整的审批流程和手续，资金不存在截留、挤占、挪用等情况。具体项目资金分配情况见附件。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。

TR41事前绩效评估：权重分为2分，实际得2分。

子洲县公安局治安监控“一线两闭环”建设项目事前绩效评估得分95分。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。（详见附件）

财政支出项目事前绩效评估得分表

评估指标及分值	评估得分	
评估指标	分值	得分
立项必要性	20	20
投入经济性	20	20
绩效目标合理性	20	15
实施方案有效性	20	20
筹资合规性	20	20

合计	100	95
----	-----	----

2.过程情况分析

该指标主要考核项目管理、组织管理两个方面，包括：实施方案完整性、预算执行率、绩效监控有效性、项目档案完整性、项目采购合规性、管理制度健全性和管理制度执行有效性等7个三级指标，指标分值20分，过程评价得18分，得分率为90%。

过程情况指标评分表

一级指	二级指标	三级指标	分值	得分	比例
GC过程 (20)	GC01绩效管理（14）	GC11实施方案完整性	3	3	100%
		GC12预算执行率	3	3	100%
		GC13绩效监控有效性	3	2	60%
		GC14项目档案资料完整性	2	1	50%
		GC15项目采购合规性	3	3	100%
	GC02组织管理（6）	GC21管理制度健全性	3	3	100%
		GC22管理制度执行有效性	3	3	100%
小计			20	18	90%

GC11实施方案完整性：权重分为3分，实际得3分。

该项目实施方案由子洲县公安局制定，实施方案从项目的建设目标、内容、原则、进度、标准和构架进行编制，明确了项目的组织保障措施，实施方案内容完整，编制合理。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

实施方案提纲

一级标题	序号	二级标题
项目建设总体要求和基本原则	1	总体要求
	2	基本要求
项目建设目标、架构、内容、模式、进度和相关技术标准	1	建设目标
	2	建设构架
	3	建设内容
	4	建设模式
	5	建设进度
	6	技术标准
成本的控制	1	
保障措施	1	加强组织领导
	2	建立协同机制
	3	强化督导检查

GC12预算执行率：权重分为3分，实际得3分。

该项目资金360万元，由子洲县财政局分两笔下达，2022年共支付333.9505万元，结余26.0495万元（质保金）。预算执行率100%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

资金明细表

单位：万元

序号	资金文件内容		预算下达文号	分配金额
1	子洲县财政局《关于下达2022年部门预算经费的通知》		（子财发〔2022〕11号）	280.00
2	子洲县财政局《关于下达2022年部门预算经费的通知》		（子财发〔2022〕258号）	80.00
序号	日期	凭证字号	摘要	金额
1	2022-9-30	JZ-09-0061	建设采购	139.8364
2	2022-12-18	JZ-12-0095	项目监理费	3.3
3	2022-12-18	JZ-12-0096	治安监控项目费用	104.8773

4	2022-12-31	JZ-12-0218	采购项目 费用	85.9368
合计				333.9505

GC13绩效监控有效性：权重分为3分，实际得2分。

根据《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发〔2019〕73号）文件要求，一般公共预算项目每年应开展绩效运行监控，并于8月份报送财政局审核。问题：一是该项目绩效运行监控未按照实际建设情况填写，项目填报日期2022年9月25日，资金支付进度330.64万元，支付率93.78%，与实际项目支付凭证日期不符。根据评分标准，该指标得66.67权重分，即2分。

GC14项目档案资料完整性：权重分为2分，实际得1分。

该指标主要考察项目的档案资料完整性、是否及时归档、是否有专人管理等资料完整性情况。存在的问题：资料存放不齐全。招投标资料未存放在部门，资料存放凌乱；未制定并有效执行档案管理制度。根据评分标准，该指标得50%权重分，即1分。

序号	资料科目
1	立项会议纪要
2	实施方案
3	资金下达文件
4	绩效目标表
5	事前绩效评估报告
6	资金支付明细表
7	政府采购验收书

8	预算绩效运行监控报告及监控表
9	预算绩效自评报告及自评表
10	项目和部门管理制度
11	招投标文件、中标通知书
12	可行性报告

GC15项目采购合规性：权重分为3分，实际得3分。

该项目采购程序为招投标，子洲县公安局委托子洲县人民政府采购中心进行采购，项目采购流程符合规范，采购合法合规、公平公开。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

GC21管理制度健全性：权重分为3分，实际得3分。

子洲县公安局依据中央、省市、县区相关政策要求，根据《子洲县预算绩效管理实施办法》第七条，主管部门具体职责：一是组织实施本部门预算绩效管理，配合财政部门开展重大项目预算绩效管理工作，督促、指导所属单位开展预算绩效管理工作；二是研究、制定本部门预算绩效管理制度和计划等相关要求。先后制定了《预算绩效目标管理办法》《预算绩效运行监控管理办法》《项目支出绩效评价管理办法》、公安局业务管理制度和资金管理制度。有效地保障了各项工作的有序开展。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

GC22管理制度执行有效性：权重分为3分，实际得3分。

该项目实施和编制绩效资料均按照预算绩效管理制度和资金管理制度进行。根据评分标准,该指标得100%权重分,即3分。

3.产出情况分析

该指标主要考核产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面,包括:完成安装微卡口37套、完成安装新立杆36套、完成双向一体智能摄像机7套、完成全景抢球10套、完成治安监控枪机8套、完成智能双舱7套、项目自评价完备性、项目验收规范性、完工及时性和成本控制率等10个三级指标,指标分值30分,产出评价得26分,得分率为86.67%。

产出情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	比例
C产出 (30分)	C01产出数量 (14分)	C11完成安装微卡口 37套	3	3	100%
		C12完成安装新立杆 36套	3	3	100%
		C13完成双向一体智能摄像机7套	2	2	100%
		C14完成全景抢球10套	2	2	100%
		C15完成治安监控枪机8套	2	2	100%
		C16完成智能双舱7套	2	2	100%
	C02产出质量 (10分)	C21项目自评价完备性	4	2	66.67%
		C22项目验收规范性	6	4	66.67%
	C03产出时效 (3)	C31完工及时性	3	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	比例
	C04产出成本（3）	C41成本控制率	3	3	100%
小计			30	26	86.67%

C11完成安装微卡口37套：权重分为3分，实际得3分。

该项目安装微卡口数量绩效目标值37套，实际完成安装微卡口37套，实际完成率100%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

C12完成安装新立杆36套：权重分为3分，实际得3分。

该项目安装新立杆数量绩效目标值36套，实际完成安装新立杆36套，实际完成率100%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

C13完成双向一体智能摄像机7套：权重分为2分，实际得2分。

该项目安装双向一体智能摄像机台数绩效目标值7套，实际完成安装双向一体智能摄像机7套，实际完成率100%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。

C14完成全景抢球10套：权重分为2分，实际得2分。

该项目安装全景抢球数量绩效目标值10套，实际完成安装全景抢球10套，实际完成率100%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。

C15完成治安监控枪机8套：权重分为2分，实际得2分。

该项目安装监控枪机绩效目标值8套，实际完成安装监控枪机8套，实际完成率100%。根据评分标准，该指标得100%

权重分，即2分。

C16完成智能双舱7套：权重分为2分，实际得2分。

该项目安装智能双舱绩效目标值7套，实际完成安装智能双舱7套，实际完成率100%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。

C21项目自评价完备性：权重分为4分，实际得2分。

存在的问题：该项目绩效自评表数量指标完成情况与分值不对应，未完成绩效目标值得满分，总得分填写有误；绩效自评报告内容填写不完整，缺少项目效益、项目具体组织管理情况等内容。根据评分标准，该指标得50%权重分，即2分。

C22项目验收规范性：权重分为6分，实际得4分。

根据子洲县公安局提供的治安监控“一线两闭环”建设项目政府采购履约验收书（货物类）得知，项目的验收时间为2022年12月21日，由验收小组进行验收，验收内容货物、品牌型号、技术性能、运行质量、售后服务、安全标准、合同履行时间等均合理。问题：项目未在计划时间内验收，计划竣工验收时间为2022年10月31日，实际验收时间为2022年12月21日。根据评分标准，该指标得66.67%权重分，即4分。

C31完工及时性：权重分为3分，实际得3分。

该项目绩效目标值竣工时间2022年10月31日，实际完工时间为2022年10月31日。完成项目绩效目标。根据评分标准，

该指标得100%权重分，即3分。

C41成本控制率：权重分为3分，实际得3分

该项目实际建设成本未超过预算成本360万元。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

4.效益情况分析

该指标主要考核社会效益、可持续影响和满意度三个方面，包括：有效化解社会矛盾、提高信息化基础能力、设备使用年限、长期提高工作效率、部门人员满意度和人民群众满意度等6个三级指标，指标分值32分，效益评价得30.73分，得分率为96.03%。

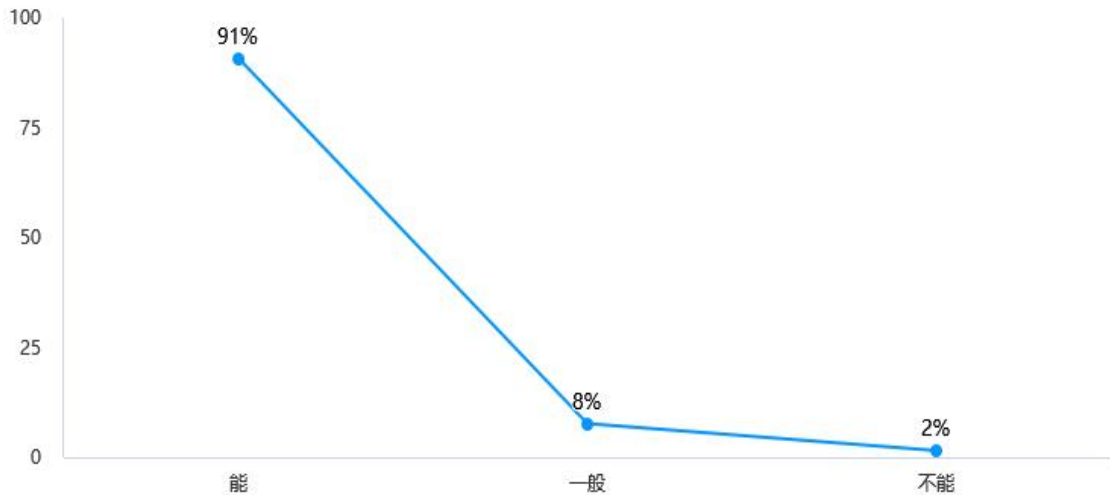
效益情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	比例
XY效益 (32分)	XY01社会效益（14）	XY11有效化解社会矛盾	7	6.68	95.38%
		XY12提高信息化基础能力	7	6.78	96.92%
	XY02可持续性影响（10）	XY21设备使用年限	5	4.65	93.08%
		XY22长期提高工作效率	5	4.62	92.31%
	XY03满意度（8）	XY31部门人员满意度	4	4	100%
		XY32人民群众满意度	4	4	100%
小计			32	30.73	96.03%

XY11有效化解社会矛盾：权重分为7分，实际得6.68分。


该指标根据子洲县公安局治安监控“一线两闭环”建设项目问卷调查第六条进行评价，共填写65份问卷调查，其中

填写能59份、一般5份、不能1份，根据满意度比率可算出 $(59 \times 100\% + 5 \times 60\% + 1 \times 0) / 65 \times 100\% = 95.38\% \times 7 = 6.68$ 。根据评分标准，该指标得95.38%权重分，即6.68分。（详见问卷调查）




XY12提高信息化基础能力：权重分为7分，实际得6.78分。

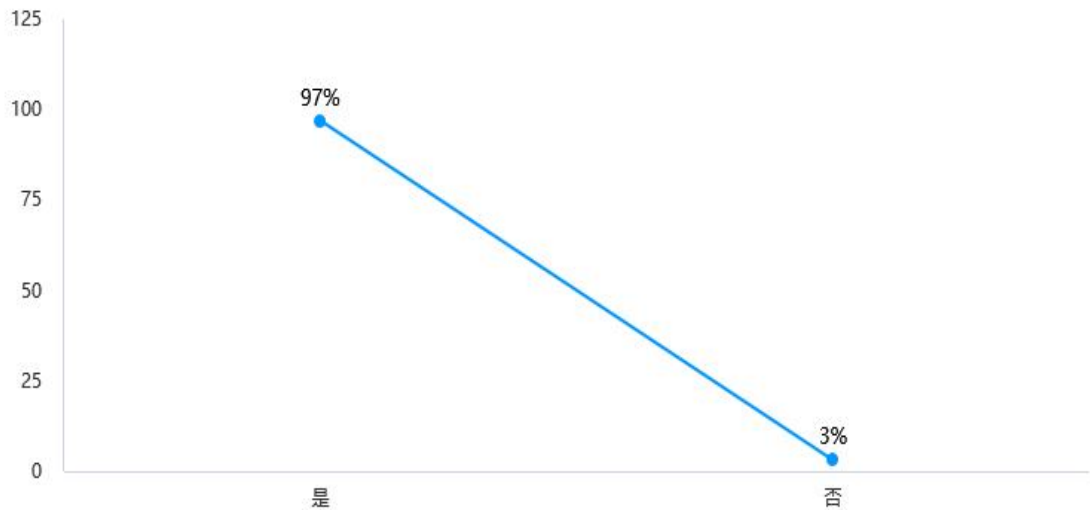该指标根据子洲县公安局治安监控“一线两闭环”建设项目问卷调查第五条：项目开展后，公安局内部机关信息化基础服务能力是否提升？进行评价，共发放65份问卷调查，其中是63份、否2份，根据满意度比率可算出 $(63 \times 100\% + 2 \times 0) / 65 \times 100\% = 96.92\% \times 7 = 6.78$ 。根据评分标准，该指标得96.92%权重分，即6.78分。




XY21设备使用年限：权重分为5分，实际得4.65分。

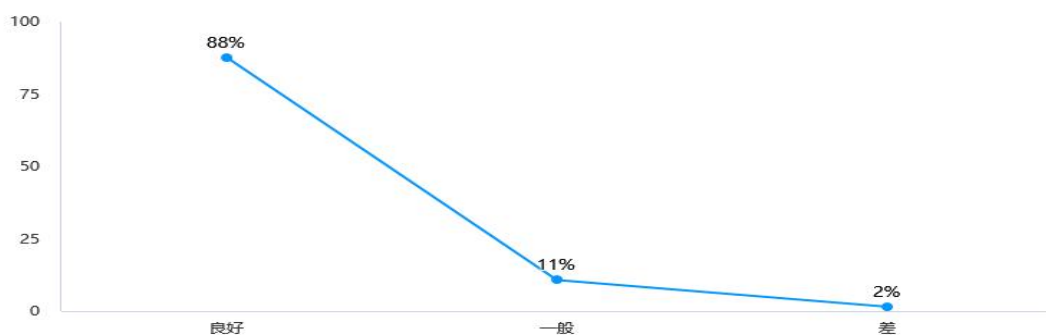该指标根据子洲县公安局治安监控“一线两闭环”建设项目问卷调查第四条：项目开展后，公安局内部机关信息化基础服务能力是否提升？进行评价，共发放65份问卷调查，其中明显提升57份、一般提升6份、无明细提升1份，根据满意度比率可算出 $(57 \times 100\% + 7 \times 60\% + 1 \times 0) / 65 \times 100\% = 93.08\% \times 5 = 4.62$ 。根据评分标准，该指标得92.31%权重分，即4.65分。




XY22长期提高工作效率：权重分为5分，实际得4.62分。

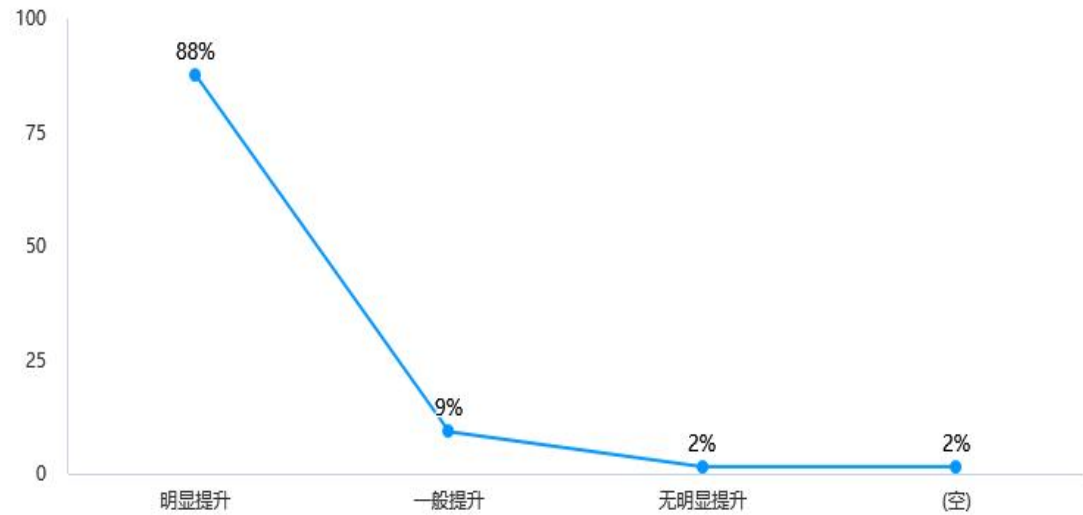该指标根据子洲县公安局治安监控“一线两闭环”建设项目问卷调查第四条：项目开展后，公安局内部机关信息化基础服务能力是否提升？进行评价，共发放65份问卷调查，其中明显提升57份、一般提升6份、无明细提升1份，根据满意度比率可算出 $(57 \times 100\% + 6 \times 60\% + 1 \times 0) / 65 \times 100\% = 92.31\% \times 5 = 4.62$ 。根据评分标准，该指标得92.31%权重分，即4.62分。




XY31部门人员满意度：权重分为4分，实际得4分。

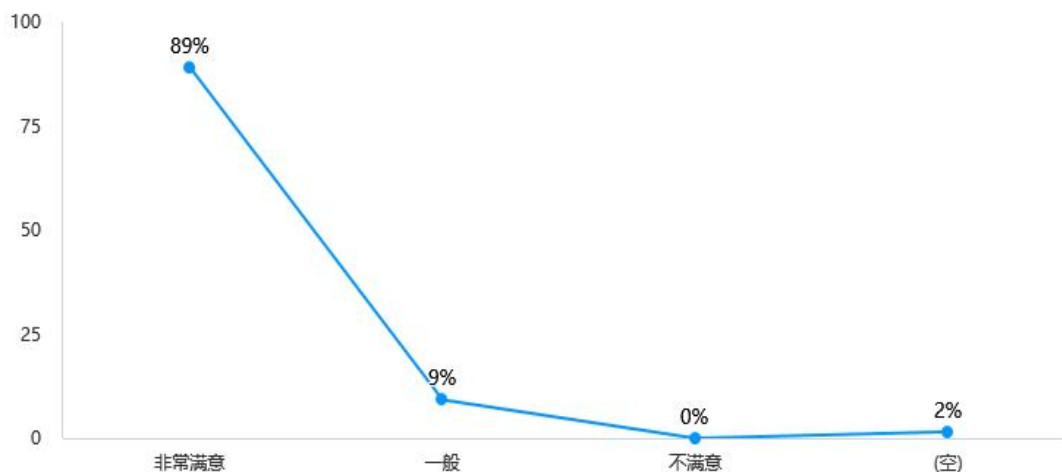该指标根据子洲县公安局治安监控“一线两闭环”建设项目问卷调查第七条：您对子洲县治安管理满意程度？进行评价，共填写64份问卷调查，其中非常满意58份、一般6份、不满意0份，根据满意度比率可算出 $(58 \times 100\% + 6 \times 60\%) / 64 \times 100\% = 95.31\%$ ，满意度大于评分标准 $\geq 95\%$ ，得满分。根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。



XY32人民群众满意度：权重分为4分，实际得4分。

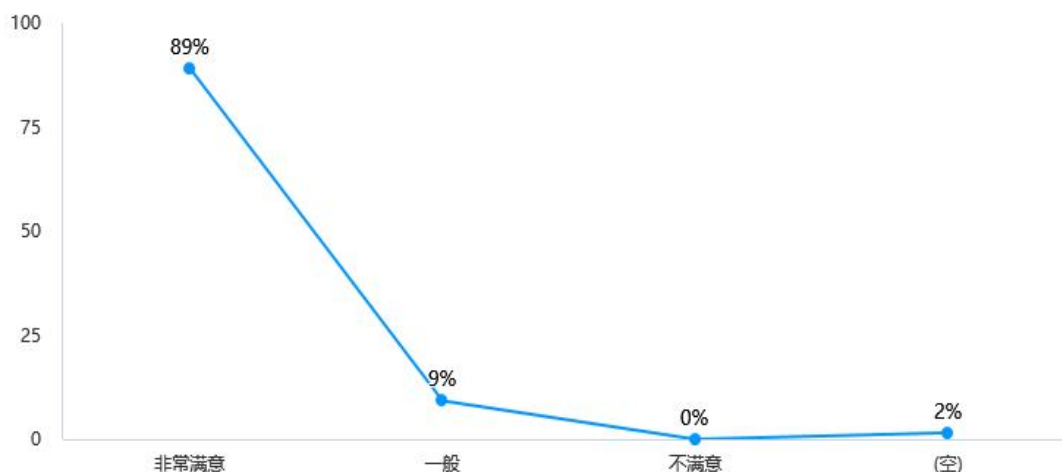该指标根据子洲县公安局治安监控“一线两闭环”建设项目问卷调查第七条：您对子洲县治安管理满意程度？进行评价，共填写64份问卷调查，其中非常满意58份、一般6份、不满意0份，根据满意度比率可算出 $(58 \times 100\% + 6 \times 60\%) / 64 \times 100\% = 95.31\%$ ，满意度大于评分标准 $\geq 95\%$ ，得满分。根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。



四、项目效益

(一) 有效化解社会矛盾、保障人民群众生命财产安全

一是可以帮助警方快速破案。（缺主语）加快警方破案进度，提高破案率；二是治安监控可以预防犯罪。（缺主语）有效地遏制犯罪行为的发生；三是可以提高社会管理水平。及时发现和处理违法乱纪行为，维护社会的公共秩序；四是提高社会管理水平、帮助人们了解安全情况。为人们创造更加安全、便利的生活环境，同时保障人民群众生命财产安全。

（二）提升公安队伍信息化服务能力、工作效率

一是提高公安队伍工作效率。通过实时监控、快速出警，使得公安队伍工作效率得到了质的提升；二是提高了公安机关服务社会能力，减少了社会损失，提高了政府宏观调控能力，减轻了公安队伍工作强度，让公安队伍办案效率和质量得到了提升。

五、存在的问题

（一）项目实施过程不规范

一是该项目未有效执行档案管理制度。项目招投标及其他资料未及时归档；二是项目未及时验收。项目计划竣工验收时间为2022年10月，项目竣工时间为2022年10月31日，最终验收时间为2022年12月21日。

（二）绩效管理意识薄弱

一是绩效目标编制。绩效指标部分不合理，三级指标（数量指标、社会效益）未细化；缺少时效、成本和可持续影响等指标，数量和质量指标值不合理，社会效益的三级指标未

明确指标值。二是该项目绩效运行监控未按照实际建设情况填写，项目填报日期2022年9月25日，资金支付进度330.64万元，支付率93.78%，与实际项目支付凭证日期不符；三是该项目绩效自评表数量指标完成情况与分值不对应，未完成绩效目标值但得满分，总得分填写有误；绩效自评报告内容填写不完整，缺少项目效益、项目具体组织管理情况等内容。

六、相关建议

（一）规范和加强项目管理

一是提高档案管理制度执行效率。安排专人负责项目资料整理，项目竣工验收后应及时对项目档案进行归档。二是规范项目验收。项目竣工后按照计划应及时组织验收，提高项目整体实施效率。

（二）增强绩效管理意识

一是认真贯彻绩效制度文件。提高绩效目标编制的明确性，细化量化绩效目标，按照《子洲县预算绩效管理实施办法》（预算支出绩效目标管理）合理绩效目标；二是根据《子洲县预算绩效管理实施办法》规定，每年八月份，预算部门要集中对1-7月预算执行情况和绩效目标实现程度开展一次绩效监控汇总分析，形成绩效监控报告。每年开展绩效自评，提高开展绩效管理工作的及时性。

七、其他说明

（一）绩效评价评分标准表

(二) 附件

(三) 问卷调查

子洲县公安局一线两闭环项目资金绩效评价评分标准表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	备注
TR 投入 (18)	TR01 项目立项 (6)	TR11 项目立项充分性 (3)	项目立项是否符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项充分性情况。	①项目符合相关法律法规、发展规划和相关政策，得 1 分； ②项目符合行业发展和政府要求，得 1 分； ③项目立项符合部门职责范围，属于部门履职所需，得 1 分。	3	
		TR12 项目立项依据程序规范性 (3)	项目立项过程是否符合相关要求，用于反映和考核项目立项依据程序规范性。	①项目按照规定的程序设立，得 1 分； ②审批文件符合相关要求，得 1 分； ③立项材料符合规定程序，得 1 分。	3	
	TR02 绩效目标 (6)	TR21 绩效目标合理性 (3)	项目所设定的绩效目标是否符合客观实际，是否具体、可衡量。	①绩效目标具体、可衡量，得 1 分； ②绩效目标的设立必须符合客观实际，得 1 分； ③项目绩效目标中产出和效益符合部门发展现状，得 1 分。 ④每个具体内容不符合对应指标，扣除 0.5 分，未细化扣 0.5 分，缺少二级指标，扣除 1 分。	2.5	
		TR22 绩效目标明确性 (3)	项目所设定的绩效目标是否科学、是否明确。	①绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分； ②绩效指标制定要通过清晰得可衡量指标予以体现，如建设规模、建设内容、建设数量	1	

				等，得 1 分； ③绩效目标表中项目目标任务与计划任务相对应，得 1 分； ④每处指标没有明确，扣除 0.5 分。		
	TR03 资金投入 (4)	TR31 预算编制合理性 (2)	预算编制是否精准、科学、合理，是否按照标准编制。	①预算编制经过科学论证，标准合理得 1 分； ②预算额度测算依据充分，按照行业标准编制，得 1 分。	2	
		TR32 资金分配合规性 (2)	项目资金管理办法是否健全、资金分配是否合理，资金使用是否符合法律法规、制度规定，考核项目资金使用合理性、合规性、安全性。	①项目资金管理制度健全，得 0.5 分； ②资金分配符合国家财经法规和财务制度及相关资金管理办法，得 0.5 分； ③资金分配符合项目预算批复或合同规定的用途，得 0.5 分； ④资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 0.5 分。	2	
	TR04 事前绩效评估 (2)	TR41 事前绩效评估 (2)	项目开展事前绩效评估工作，事前绩效评估方案是否完整，项目开展依据是否充足。	①项目事前绩效评估得分 ≥ 80 ，得 1 分； ②项目事前绩效评估报告内容完整，得 1 分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	备注
GC 过程 (20)	GC01 项目管理 (14)	GC11 实施方案完整性 (3)	主要考察项目施工方案是否合理，是否设计均衡，用以反映项目施工对于项目总体建设的合理程度。	该指标采用扣分制： ①施工方向不明确，扣 1.5 分； ②施工方案内容不完整，扣 1.5 分。	3	
		GC12 预算执行率 (3)	考察项目资金使用进度，用于反映和考核项目资金使用效率。	预算执行率（实际支付资金/实际到位资金）×100%。实际支付资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	
		GC13 绩效监控有效性 (3)	考察项目建设过程中对于质量监控的管理情况，用以反映项目监控对项目实施质量监督情况。	①项目监理按照规定监督管理，监理报告内容完整，得 1.5 分； ②及时开展项目绩效运行监控，绩效目标无偏差，得 1.5 分；未及时开展扣除 1 分； ③绩效运行监控资料不完整，扣除 1 分。 ④绩效监控填写与实际情况不符合，每处扣除 0.5 分。	2	
		GC14 项目档案资料完整性 (2)	考察本项目项目档案管理情况，用以反映档案存放齐全，档案管理规范情况。	①项目资料完整、齐全，得 1 分，缺少一类资料扣除 0.2 分，扣完为止； ②制定档案管理制度并安排专人负责，得 0.5 分； ③项目档案归档及时、规范，得 0.5 分；	1	
		GC15 项目采购合规性 (3)	考察项目采购是否符合法律法规、	①项目按照政府采购相关规定进行采购，采购流程规范，得 1 分；	3	

			相关采购文件、招投标、中标是否按照正常程序进行，用以反映采购项目采购的合法合规性、公平公开性。	②项目采购合法合规、公平公开，得1分； ③项目采购文件齐全（包括招标文件、投标文件、评审意见、中标通知书、项目合同等），得1分。		
	GC02 组织管理（6）	GC21 管理制度健全性（3）	考察项目资金管理制度，项目内控制度，绩效管理制度是否齐全。	①项目管理制度齐全，得3分； ②缺少一项制度，扣除1分； ③项目管理制度内容不完整，扣1分。	3	
		GC22 管理制度执行有效性（3）	考察项目单位是否按照项目管理制度进行管理，执行效率如何。	①项目单位按照项目管理制度严格执行，得满分； ②根据项目单位制度有效执行情况进行合理扣分。	3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	备注
C 产出（30）	C01 产出数量（14）	C11 完成安装微卡口 37 套	项目实施的实际产出与计划产出相比，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①完成安装微卡口 37 套，得 3 分，根据上述建设内容完成比率，进行得分，100%得满分，其余比率×分值。	3	
		C12 完成安装新立杆 36 套		②完成安装新立杆36套，得3分，根据上述建设内容完成比率，进行得分，100%得满分，其余比率×分值。	3	

		C13 完成双向一体智能摄像机 7 套		②完成双向一体智能摄像机7套，得2分，根据上述建设内容完成比率，进行得分，100%得满分，其余比率×分值。	2	
		C14 完成全景枪球 10 套		②完成全景枪球10套，得2分，根据上述建设内容完成比率，进行得分，100%得满分，其余比率×分值。	2	
		C15 完成治安监控枪机 8 套		②完成治安监控枪机8套，得2分，根据上述建设内容完成比率，进行得分，100%得满分，其余比率×分值。	2	
		C16 完成智能双舱 7 套		②完成智能双舱7套，得2分，根据上述建设内容完成比率，进行得分，100%得满分，其余比率×分值。	2	
	C02 产出质量 (10)	C21 项目自我评价完备性 (6)	考察项目绩效工作进展，是否开展绩效自评、形成绩效自评报告、绩效自评是否按照绩效目标进行评价，绩效自评填写是否符合实际，是否完整。	①未开展绩效自评，不得分； ②绩效自评表不符合实际，扣 2 分； ③绩效自评报告内容填写不完整，扣 2 分， ④自评填写不规范，扣 2 分。	4	

		C22 项目验收规范性 (4)	验收方式是否合理, 验收结构是否权威及验收成果是否公正, 用以反映和考核验收情况。	①项目在既定的时间内进行验收, 得 2 分; ②项目验收报告规范, 完整, 得 1 分; ③项目验收合理、公正, 不违反相关法律法规, 得 2 分; ④项目验收合格率达到 100%, 得 1 分。	2	
	C03 产出时效 (3)	C31 完工及时性 (3)	考察项目完工是否及时, 用以反映和考核项目完工时效目标的实现程度。	①按照合同时间及时竣工, 得满分; ②项目合同开工晚于计划开工, 扣 1.5 分; ③项目竣工晚于合同竣工期限, 扣除 1.5 分。	3	
	C04 产出成本 (3)	C41 成本控制率 (3)	完成项目计划工作目标的实际成本和计划成本比率, 用以反映是否超出计划成本。	①实际成本未超出计划成本, 得满分; ②实际成本超过计划成本, 按照超出比例, 每超出 1%, 扣除 0.5 分, 扣完为止。	3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	备注
XY 效益 (32)	XY01 社会效益 (14)	XY11 有效化解社会矛盾 (7)	该指标主要考察项目运行后, 是否能够有效化解社会矛盾。	①根据社会调查满意度比率得分, 有效化解满意人数/总人数 $\times 100\%$ $\times$ 分值, 得相应分值。	6.68	

		XY12 提高信息化基础能力 (7)	该指标主要考察项目运行后, 提高公安队伍信息化能力有效情况。	①根据社会调查满意度比率得分, 填写提升效果佳的人数/总人数 $\times 100\%$ $\times$ 分值, 得相应分值。	6.78	
	XY02 可持续影响 (10)	XY21 设备使用年限 (4)	该指标考察项目设备使用年限是否达到行业标准。	①根据社会调查满意度比率得分, 填写设备运行质量优良人数/总人数 $\times 100\%$ $\times$ 分值, 得相应分值。	4.65	
		XY22 长期提高工作效率 (6)	该指标考察项目运行后, 是否长期提升公安队伍工作效率。	根据长期提高公安队伍工作效率显著情况进行得分; ①根据社会调查满意度比率得分, 填写满意人数/总人数 $\times 100\%$ $\times$ 分值, 得相应分值。	4.62	
	XY03 社会公众满意度(8)	XY31 部门人员满意度 (4)	该指标主要考察项目运行后, 公安系统内部人员对于项目满意程度。	通过社会调查, 满意人数和问卷填写人数相比, 满意度在 95%以上, 得满分; 满意度在 95%至 60%之间, 按照比率 $\times$ 分值得相应得权重分; 满意度在 60%以下不得分。	4	
		XY32 人民群众满意度 (4)	该指标主要考察人民群众对于该项目的满意程度。	通过社会调查, 满意人数和问卷填写人数相比, 满意度在 95%以上, 得满分; 满意度在 95%至 60%之间, 按照比率 $\times$ 分值得相应得权重分; 满意度在 60%以下不得分。	4	
总分 (100)					90.23	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县公安局一线两闭环建设项目						
主管部门及代码		子洲县公安局 125001			实施单位	子洲县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360	330.64	100%	10	93.78%	10	
	其中：财政拨款	352.54	330.64	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设横贯子洲县 307 国道、县城县域内外两级防控圈及城区主要部位的感知能力，实现精准防范、出入防控，动态监管、立体追溯等多要素管控，全面提升对各类风险隐患的自动识别、敏锐感知和预测预警预防能力。			基本完成既定目标				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出	数量	新立杆	36 套	30 套	6	6	
			各类前端设备	70 套	65 套	6	6	
			侦码仪器	3 套	2 套	2	2	
			车载侦测仪	3 套	2 套	2	2	
			移动布控球	1 套	1 套	2	2	
			后台管理、分析及存储系统	1 套	1 套	2	2	
		质量	所有产品符合国标要求，验收合格率	≥95	≥95	20	20	
		时效	项目完成时间	2022 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 31 日	10	10	
		成本	预算控制数	≤360	≤360	10	9	
	效益	社会效益	提升公安机关信息化服务能力、工作效率，减轻工作强度，化解社会矛盾。	基本完成	基本完成	10	10	
可持续影响		为今后公安监机关防范风险、打击犯罪提高保障	基本完成	基本完成	10	10		
	满意度	服务对象满意度	部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	89	

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称： 一线两闭环

自评项目单位： 子洲县公安局

项目主管部门： 子洲县公安局

项目单位法人代码： 116108310160934839

评价工作组负责人： 马腾

联系人： 13891252968

评价时间：2023 年 4 月 19 日

附件 1:

2022 年财政支出项目绩效运行跟踪监控报告

填报部门(盖章):


填报日期: 2022 年 9 月 25 日

项目基本情况	项目名称	子洲县公安局治安监控“一线两闭环”建设		财政预算资金	360
	项目属性	☒ 新建 ☐ 续建	项目负责人	黄春生	
	项目主要内容	子洲县公安局治安监控“一线两闭环”建设支出			
项目组织管理情况	项目立项依据	会议纪要			
	可行性研究报告和专家评审结论	是			
	项目是否进行财政支出事前绩效评估	是			
	是否实施政府采购	☒ 是 ☐ 否 应采购 万元,实际采购 万元	是否实施招投标	☒ 是 ☐ 否	
	是否财政专户管理	☒ 是 ☐ 否			
	管理制度和办法及具体工作措施	按照子洲县公安局财务制度管理办法执行			
	项目调整内容及报批程序和手续	无			
项目实施情况	项目总体实施情况	完成数量	完成比例		
	项目实施进度	按进度完成	95%		
	资金支付进度	330.64	93.78%		
	其中:资金主要支付的凭证号及凭证中支付的金额	支付凭证号: 125001110000045860 金额: 1398364.00 125001110000060750 金额: 1048773.00 125001110000073003 金额: 859368.54			
资金安排使用情况	资金分类	应到位资金	实到资金	实际支出	结余资金
	上级财政(中省市)	352.54	352.54	330.64	21.9 万(质保金)
	县级财政				
	其他资金				
	合 计	352.54	352.54	330.64	21.9 万(质保金)

财政支出项目事前绩效评估得分表

评估指标及分值		评估得分
评估指标	分值	得分
立项必要性	20	20
政策相关性	5	5
职能相关性	5	5
需求相关性	5	5
财政投入相关性	5	5
投入经济性	20	20
投入合理性	10	10
成本控制措施有效性	10	10
绩效目标合理性	20	15
目标明确性	10	10
目标合理性	10	5
实施方案有效性	20	20
实施内容明确性	6	6
实施方案可行性	7	7
过程控制有效性	7	7
筹资合规性	20	20
筹资合规性	10	10
财政投入能力	5	5
筹资风险可控性	5	5
合计	100	95

政府采购履约验收书（货物类）

采购单位	长洲县公路局		项目名称	长洲县公路局治虫监测站 “一线两河”建设示范项目		合同名称	
供应商	陕西宇志建设工程有限公司		项目及合同编号	22CG2022006 YW-2021-HZ-042		合同金额	34510.00
验收时间	2022年12月21日		验收地点	长洲县公路局		验收组织形式	☐ 自行简易验收 ☒ 验收小组验收
验收内容	货物清单 合格 ☒ 不合格 ☐	品牌、型号、规格、数量及外观质量 合格 ☒ 不合格 ☐	技术、性能指标 合格 ☒ 不合格 ☐	运行状况及安装调试 合格 ☒ 不合格 ☐	质量证明文件 合格 ☒ 不合格 ☐	售后服务承诺 合格 ☒ 不合格 ☐	安全标准 合格 ☒ 不合格 ☐
专业检测机构情况说明							
存在问题和改进意见	无						
最终结论	合格 ☒ 不合格 ☐						
验收小组成员名单（签字）	组长：马皓 成员：刘赞 马建 高晓东						
采购中心（代理机构）				采购单位意见			
经办人：刘赞 负责人：张雪锋  (公章)				经办人：马皓 马建 负责人：  (采购单位公章)			
供应商确认：  (单位公章或授权代表签字)				财政局备案情况： 			

说明：1、本表经财政局备案后方可支付资金。

2、本表一式三份，采购中心（代理机构）（白）、财政局（粉）、采购单位（黄）各一份。

附件3

填报单位（盖章）

专项资金项目支出绩效监控表

项目名称	子洲县公安局治安监控“一线两闭环”建设项目									
	产出指标	数量指标	质量指标	成本指标	时效指标	产出指标	数量指标	质量指标	成本指标	时效指标
	车辆检测仪器	3套	2套	无	完成	无	无	无	无	
	车载检测仪器	3套	2套	无	完成	无	无	无	无	
	移动布控球	1套	1套	无	完成	无	无	无	无	
	后台管理、分析及存储系统	1套	1套	无	完成	无	无	无	无	
	所有产品符合国家标准要求，验收合格	≥95	≥95	无	完成	无	无	无	无	
	预算控制数	≤360万	≤360万	无	完成	无	无	无	无	
	项目完成时间	2022年10月31日	2022年10月31日	无	完成	无	无	无	无	

凭证箱


子洲县公安局

日期	凭证字号	摘要	财务会计金额	预算会计金额	凭证来源	差异项
2022-09-30	JZ-09-0061	治安监控一线两闭环建设采购	1,398,364.00	1,398,364.00	机制凭证生成	存在差异
2022-12-18	JZ-12-0095	一线两闭环治安监控项目工程监理费	33,000.00	33,000.00	机制凭证生成	没有差异
2022-12-18	JZ-12-0096	一线两闭环治安监控	1,048,773.00	1,048,773.00	机制凭证生成	存在差异
2022-12-31	JZ-12-0218	一线两闭环建设采购项目欠款11396	859,368.54	859,368.54	机制凭证生成	存在差异
2022-12-31	JZ-12-0220	一线两闭环建设采购项目款	0.00	0.00	机制凭证生成	没有差异




子洲县公安局治安监控“一线两闭环”建设项目问卷调查



1.您是公安队伍还是人民群众？ [单选题]

选项	小计	比例
公安队伍	56	 86.15%
人民群众	9	 13.85%
本题有效填写人次	65	

2.您了解子洲县公安局开展的治安监控项目吗？ [单选题]

选项	小计	比例
了解	60	 92.31%
不了解	5	 7.69%
本题有效填写人次	65	

3.新安装的治安监控运行质量如何？ [单选题]

选项	小计	比例
良好	57	 87.69%
一般	7	 10.77%
差	1	 1.54%
本题有效填写人次	65	

4.设备运行后，公安局工作效率是否有所提升？ [单选题]

选项	小计	比例
明显提升	57	87.69%
一般提升	6	9.23%
无明显提升	1	1.54%
本题有效填写人次	65	

5.项目开展后，公安局内部机关信息化基础服务能力是否提升？（针对公安队伍） [单选题]



选项	小计	比例
是	63	96.92%
否	2	3.08%
本题有效填写人次	65	

6.系统运行后，能否有效化解社会矛盾，减少社会安全事件发生？ [单选题]

选项	小计	比例
能	59	90.77%
一般	5	7.69%
不能	1	1.54%
本题有效填写人次	65	

7.您对子洲县治安管理满意程度？ [单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

非常满意	58	 89.23%
一般	6	 9.23%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	65	

8.您对子洲县治安管理有何良策？

序号	建议
1	继续加大对监控探头的建设
2	向科技要警力，强化警务勤务工作信息化水平
3	积极努力工作，创建大美子洲
4	继续加大监控设施建设，做到0死角，全覆盖
5	进一步改善工作效率。提高服务水平
6	增加监控数量
7	1、加强基础建设投入（人、财、物）；2、建立长效机制；3、网格化管理；4、加强流动人口及出租房屋管理；5、与政府部门相结合、信息共享等
8	进一步加强信息化建设，提升街面监控覆盖率
9	定时摸排，及时打击
10	以防为主，打防结合
11	加强巡逻、加大智能化应用
12	近些年，子洲县治安良好，较早些年有明显提升
13	从优待警、加强城区街道监控覆盖率
14	充实公务员队伍，过渡一批事业编制人员
15	治安管理实战单位有效警力不足，希望加强
16	建议继续加强治安监控、建议加强治安巡逻
