

# 2022 年子洲县山地苹果基地建设项目绩效评价报告

评价单位：陕西领远知识产权有限公司

评价日期：2023 年 8 月 1 日

# 目 录

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 一、基本情况 .....                      | - 1 -  |
| (一) 项目概况 .....                    | - 1 -  |
| (二) 项目绩效目标 .....                  | - 2 -  |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....                | - 4 -  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 .....            | - 4 -  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准 ..... | - 4 -  |
| (三) 评价依据 .....                    | - 7 -  |
| (四) 绩效评价工作过程 .....                | - 7 -  |
| 三、综合评价情况及评价结论 .....               | - 9 -  |
| (一) 综合评价情况 .....                  | - 9 -  |
| (二) 评价结论 .....                    | - 10 - |
| 四、绩效评价指标分析 .....                  | - 12 - |
| (一) 项目决策情况 .....                  | - 12 - |
| (二) 项目过程情况 .....                  | - 16 - |
| (三) 项目产出情况 .....                  | - 19 - |
| (四) 项目效益情况 .....                  | - 21 - |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....        | - 23 - |
| (一) 主要经验及做法 .....                 | - 23 - |
| (二) 存在的问题 .....                   | - 23 - |
| 六、有关建议 .....                      | - 24 - |
| 七、其他需要说明的问题 .....                 | - 25 - |
| 附件 1: .....                       | - 26 - |

## 2022 年子洲县山地苹果基地建设项目

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 项目名称     | 2022 年子洲县山地苹果基地建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| 项目主管部门   | 子洲县农业农村局                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |
| 项目实施单位   | 子洲县农业农村局                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |
| 支出项目起止时间 | 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |
| 投资总金额    | 100.00 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |
| 其中：自筹资金  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 自有资金     | 0.00 万元   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 信贷资金     |           |
| 财政补助资金总额 | 100.00 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上级财政补助   | 100.00 万元 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 县本级补助    | 00.00 万元  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 区县配套金额   |           |
| 实际到位金额   | 100.00 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目实际支出金额 | 100.00 万元 |
| 项目概况     | <p>该项目在全县 13 个乡镇(办、中心)的 20 个村建设标准化果园 1000 亩(含补栽苗木、栽植补助等)。槐树岔:大坪 50 亩、芹园 50 亩。马蹄沟:张圪台 35 亩。何集:高塔 30 亩、苗家沟 35 亩。老君殿:南洼 45 亩、贺家渠 50 亩。淮宁湾:清水沟 60 亩、张家渠 45 亩。裴家湾:小沟则 35 亩、张家河 65 亩。驼耳巷:刘家湾 50 亩。苗家坪:徐家河 50 亩。水地湾:梁家沟 40 亩。李孝河:李孝河 60 亩、白草洼 60 亩。电市:王庄 80 亩。周家硷:后湾 60 亩。三川口:吴山 50 亩、红花楼 50 亩。</p> |          |           |
| 项目绩效目标   | <p>为了稳步提升全县苹果基地面积和质量，在全县 18 个乡镇的 20 个村建设标准化果园 1000 亩(含补栽苗木、栽植补助等)。</p>                                                                                                                                                                                                                       |          |           |
| 支出执行情况   | <p>2022 年子洲县山地苹果基地建设项目资金 100 万元，截至本次评价日，已支付资金 100 万元，资金支付率 100%。</p>                                                                                                                                                                                                                         |          |           |
| 绩效评价结论   | <p>2022 年子洲县山地苹果基地建设项目综合评价得分为 92.5 分。根据《子洲县人民政府办公室关于印发子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》(子政办发【2021】27 号)项目得分级别划分标准，本项目总体评价结果为<b>优秀</b>。</p>                                                                                                                                                             |          |           |

## 2022 年子洲县山地苹果基地建设项目绩效评价报告

为全面检验子洲县山地苹果基地建设项目资金的使用绩效,考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果,进一步提高财政支出的管理水平,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》(陕财办绩【2020】9号)、《子洲县山地苹果标准园建设实施方案》、《2022 年果业项目联农带农实施方案》。我们审核了子洲县农业农村局提供的项目相关资料,结合评审意见,形成了本评价报告。

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目概况

子洲县山地苹果基地建设项目,在县委县政府和相关部门的统一指导下,在我县各乡镇实施运行推广,按照“稳规模、提品质,延链条、强保障”的发展思路,以“产后整理、防灾减灾、节水灌溉、水肥一体化生产示范”等为重点,促进一二三产融合发展,真正实现“果业强,果农富,果乡美”目标,建设标准果园 1000 万亩。

##### 2. 资金投入和使用情况

子洲县山地苹果基地建设项目资金 2022 年共收到 100 万元,

其中县本级财政预算 100 万元。2022 年下拨资金 100 万元，受益乡镇共计 13 个。其中：槐树岔：大坪 50 亩、芹园 50 亩。马蹄沟：张圪台 35 亩。何集：高塔 30 亩、苗家沟 35 亩。老君殿：南洼 45 亩、贺家渠 50 亩。淮宁湾：清水沟 60 亩、张家渠 45 亩。裴家湾：小沟则 35 亩、张家河 65 亩。驼耳巷：刘家湾 50 亩。苗家坪：徐家河 50 亩。水地湾：梁家沟 40 亩。李孝河：李孝河 60 亩、白草洼 60 亩。电市：王庄 80 亩。周家硷：后湾 60 亩。三川口：吴山 50 亩、红花楼 50 亩。子洲县山地苹果基地建设项目在 2022 年 12 月 31 日前完成拨付。项目资金主要用于以下方面：

**表 1 2022 年山地苹果标准园建设项目财政资金使用情况**

| 序号 | 项目名称       | 计量单位 | 工程量   | 支付金额（万元） |
|----|------------|------|-------|----------|
| 1  | 苹果苗采购      | 株    | 20000 | 30       |
| 2  | 山地苹果基地建设补助 | 亩    | 700   | 70       |
|    | 合 计        |      |       | 100      |

## （二）项目绩效目标

根据 2022 年子洲县山地苹果基地建设项目的绩效目标，本项目的总体绩效目标为促进我县子洲县山地苹果基地建设，提高果园建设科学化，确保子洲县山地苹果基地建设项目统一规划设计。具体如下：

### 1. 产出指标

#### （1）数量指标

2022 年共安排收益项乡镇 13 个。其中：槐树岔：大坪 50 亩、芹园 50 亩。马蹄沟：张圪台 35 亩。何集：高塔 30 亩、苗家沟 35 亩。老君殿：南洼 45 亩、贺家渠 50 亩。淮宁湾：清水沟 60 亩、张家渠 45 亩。裴家湾：小沟则 35 亩、张家河 65 亩。驼耳巷：刘家湾 50 亩。苗家坪：徐家河 50 亩。水地湾：梁家沟 40 亩。李孝河：李孝河 60 亩、白草洼 60 亩。电市：王庄 80 亩。周家硷：后湾 60 亩。三川口：吴山 50 亩、红花楼 50 亩。

## （2）质量指标

工程验收合格率 100%。

## （3）时效指标

2022 年 6 月 30 日。

## （4）成本指标

奖补金额 100.00 万元。

# 2. 效益指标

## （1）社会效益指标

项目实施受益总农户  $\geq 50$  户、防返贫监测对象受益户数  $\geq 100$  人。

## （2）经济效益指标

通过土地流转、务工就业、技能培训、带动果农实现增收  $\geq 5\%$ 。

## （3）生态效益指标

提高土地有机质含量面积。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标

果农满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过绩效评价，衡量子洲县山地苹果基地建设项目，评价资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，并总结经验，分析存在的问题，有针对性地采取有效措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

#### 2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象是子洲县山地苹果基地建设项目，共涉及资金 100.00 万元。本次评价主要以项目决策、过程、产出和效益四个方面进行绩效评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

#### 1. 评价原则

本次评价遵循目标导向性原则、科学客观性原则和公平公正性原则，评价组在开展本次绩效评价时遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联

系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益、可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（6）回避原则。评价工作人员与项目单位无任何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

（7）保密原则。评价工作人员，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 评价指标体系

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩【2020】9号）、《子洲县山地苹果标准园建设实施方案》、《2022年果业项目联农带农实施方案》，子洲县财政预算绩效评价中心在原有申报年度预算支出绩效目标基础上，共同修改、设置、制定用于此次绩效评价的指标体系以及



相应的评分细则；评价指标设置三级，其中一级指标 4 个，二级指标 14 个，三级指标 27 个（具体指标设置及评价标准详见附件 1）。指标内容主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分 100 分。

### 3. 评价方法

本项目进行绩效评价时采用比较法、层次分析法、公众评判法、因素分析法等方法对子洲县山地苹果标准园建设项目的决策、过程、产出和效益做出客观、公正的评价。

（1）比较法：通过比较项目实施产生的实际结果与预定目标，找出差异与不足，对项目的各项绩效目标进行分析与评价。

（2）层次分析法：结合政策文件，制定项目绩效评价指标体系，应用该体系进行评价。

（3）公众评判法：通过开展较为广泛的公众问卷调查和抽样分析，对项目产生的效果进行评判，以评价绩效目标实现程度。

（4）因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

### 4. 评价标准

本次评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据子洲县人民政府办公室《关于

印发子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》（子政办发【2021】27号），按照最终得分将绩效评价分为四个等级：

综合得分在 70 分以下为差；

综合得分在 70-80 分（含 70 分）为一般；

综合得分在 80-89 分（含 80 分）为良好；

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优秀。

### （三）评价依据

- 1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》。
- 2.《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》。
- 3.《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩【2020】9号）。
- 4.《子洲县山地苹果基地建设项目实施方案》。
- 5.《2022 年果业项目联农带农实施方案》
6. 资金拨付文件及相关资料。
7. 其他相关依据。

### （四）绩效评价工作过程

评价组通过广泛收集项目资料并分析项目情况，采用查阅资料、深度访谈与问卷调查相结合的方法收集一手数据，通过对资料分析、研究、总结，运用对比法、逻辑分析法对项目评分，得出项目取得的成绩，指出项目存在的问题，提出相关建

议。

2023年4月初，评价组积极与项目单位联系，了解项目概况，包括项目的内容、管理制度、资金流程等，并对相关项目进行了走访调研，包括访谈负责人、数据材料收集等，于4月上旬完成了前期调研工作，明确了绩效评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准等。4月下旬，评价组严格按照工作方案经过数据采集、重点复核、问卷调查、社会访谈、数据分析和报告撰写环节，顺利完成了绩效评价工作。

本次财政资金绩效评价工作计划分为四个阶段：

### **1. 前期准备阶段**

为保证本次绩效评价工作顺利开展，充分把控项目风险及项目绩效管理相关工作成果和质量，我组与项目单位沟通落实绩效评价工作的具体要求；此外，我组内部召开绩效评价工作部署会议，成立绩效评价工作组，制定项目工作计划，对评价组成员提出任务、职业道德和保密工作要求。

评价组深入学习了财政支出绩效评价和项目管理方面的制度和政策，学习了项目评价指标体系和项目评价方案，并明确评价工作开展程序及阶段性要求，拟定《子洲县山地苹果标准园建设项目体系及得分表》。

### **2. 组织实施阶段**

评价组按照绩效评价实施方案和绩效评价指标体系，组织赴项目单位调研，现场考察与收集初步资料，采集政策文件、

操作办法、管理制度和项目的基本信息等，确定评价的方向、评价的重点等内容；依据评价指标体系搜集项目业务、财务资料，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；对搜集的资料进行分类、整理，开展资金使用情况调查工作；加强与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会，撰写调研阶段情况综合报告。

### **3. 实地核查**

为保证绩效评价数据的真实、完整，此次评价对抽取项目进行实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证项目资料的真实性；另一方面对项目建设内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

### **4. 分析评价**

按照制定的绩效评价指标体系，根据收集的资料、访谈与问卷调查等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。在前期资料收集、访谈、问卷调查、分析研究、归纳总结的基础上，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，组长负责报告的总纂；与项目单位沟通并修改完善后，形成正式绩效评价报告；根据工作人员评审意见，进一步修改优化评价报告。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）综合评价情况**

本次绩效评价工作在中心领导的指导下，根据现场评价情况

和资金使用单位的自评材料，评价小组认为，子洲县山地苹果标准园建设项目资金在品种改良高头嫁接、标准园创建等方面发挥了重要作用。但是绩效目标设置不全面；项目数量指标未做细化、项目完工时间滞后等问题。综合评定，本专项资金的绩效评分为**90.5**分，绩效表现为优秀。

## （二）评价结论

评价小组在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，并结合子洲县农业农村局对项目的组织监督和管理情况，依据项目绩效评价指标体系进行评分，子洲县山地苹果基地建设项目资金绩效评价综合得分为**92.5**分，评价等级为“优秀”。具体评分见下表：

表 2 2022 年子洲县山地苹果基地建设项目资金指标评分表

| 项目   | 标准分值   | 评价得分  | 得分率     |
|------|--------|-------|---------|
| 决策指标 | 23.00  | 20.00 | 86.96%  |
| 过程指标 | 17.00  | 15.50 | 91.18%  |
| 产出指标 | 31.00  | 28.00 | 90.32%  |
| 效益指标 | 29.00  | 29.00 | 100.00% |
| 分数合计 | 100.00 | 92.50 | 92.5%   |

图 1 一级指标得分示意图

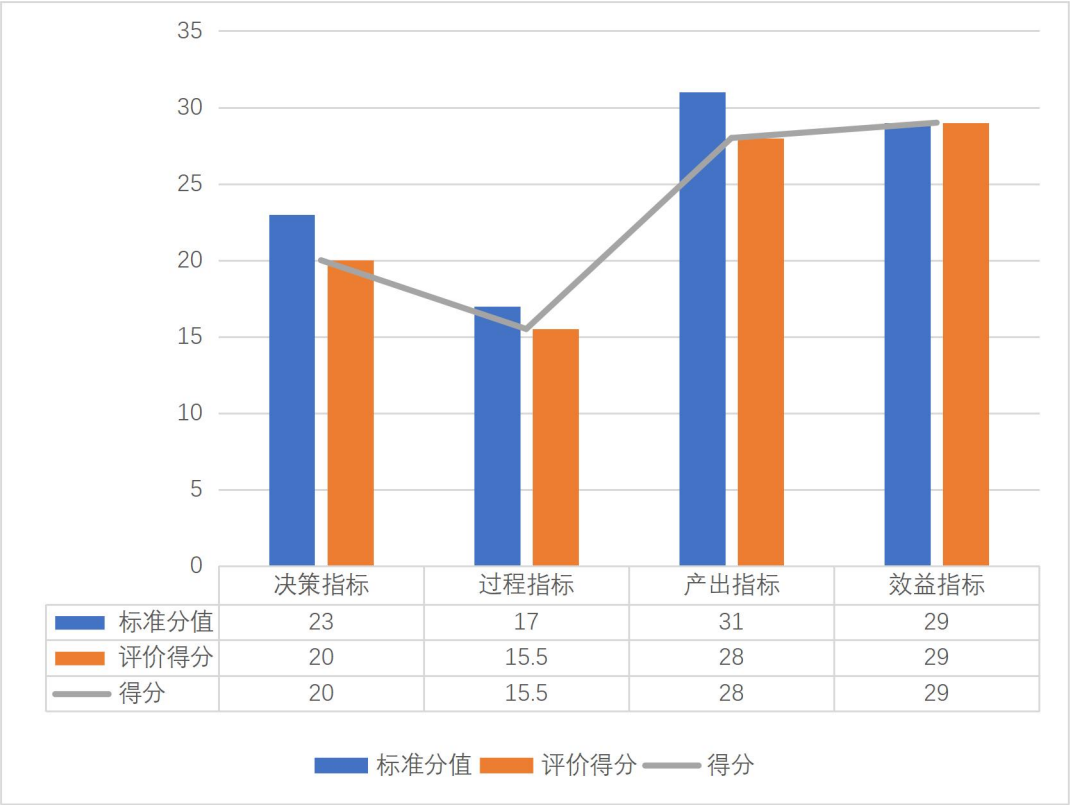


图 2 二级指标得分示意图

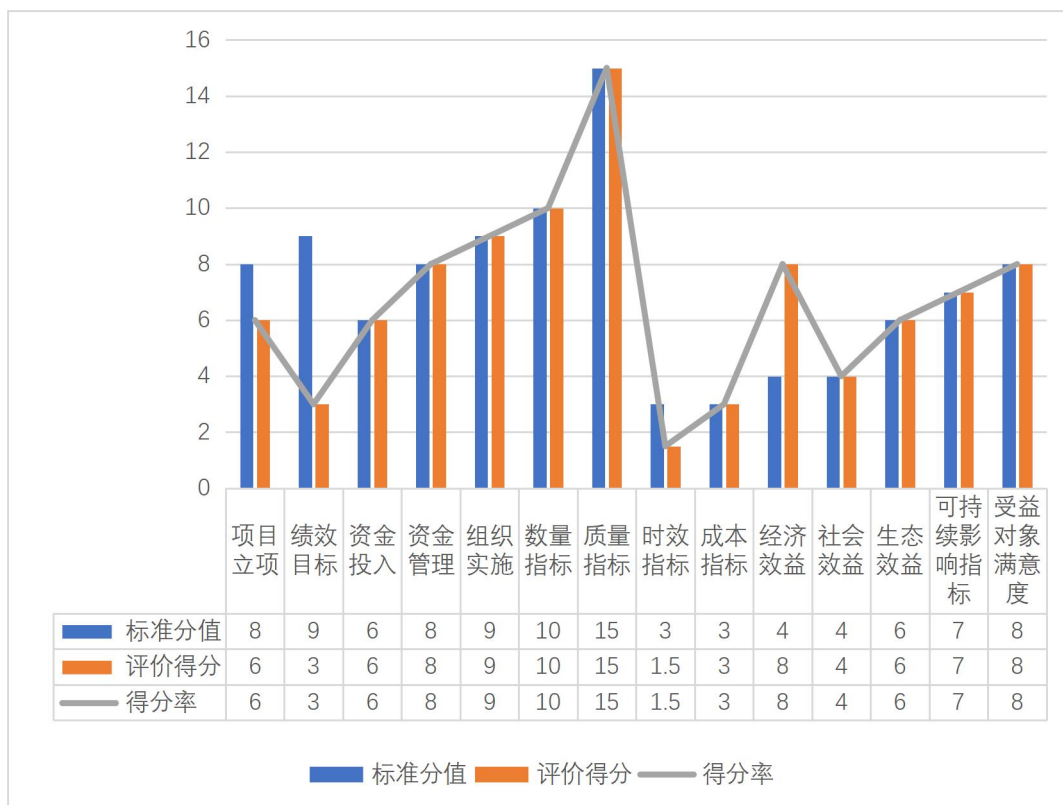


图 1、2 显示，在决策指标、过程指标、产出指标和效益指标四方面，产出指标得和效益指标得分最高，反映出子洲县山地苹果基地建设项目资金立项过程规范，产出指标和过程指标得分较低，反映出子洲县农业农村局项目绩效编制业务能力钻研不够，项目实施过程中时间把握不够精准。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目决策指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入三方面内容，共细化为 7 个三级指标，权重分 23.00 分，本次评价得分 20.00 分，得分率为 86.96%，评分详细如下：

表 3 项目决策得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 标准分值  | 评价得分  | 得分率     |
|------|------|-------|-------|---------|
| 决策指标 | 项目立项 | 8.00  | 8.00  | 100.00% |
| 决策指标 | 绩效目标 | 9.00  | 6.00  | 66.66%  |
| 决策指标 | 资金投入 | 6.00  | 6.00  | 100.00% |
| 合计   |      | 23.00 | 20.00 | 86.96%  |

### 1. 项目立项

该指标分值 8.00 分，本次评价得分 6.00 分。本指标主要从立项依据充分性和项目立项规范性两个方面进行评价。经评价，本项目未见公示公开材料，扣 2.00 分，该指标得 6.00 分。

表 4 项目立项得分情况表

| 二级指标 | 三级指标    | 标准分值 | 评价得分 | 得分率     |
|------|---------|------|------|---------|
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 项目立项 | 项目立项规范性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 合计   |         | 8.00 | 8.00 | 100.00% |

(1) 立项依据充分性，该指标分值 4.00 分，本次评价得 4.00 分，主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，该



指标得 4.00 分。

(2) 项目立项规范性,该指标分值 4.00 分,本次评价得 2.00 分,主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。经检查项目资料,本项目立项基本符合相关要求,该指标得 4.00 分。

## 2. 绩效目标

该指标分值 9.00 分,本次评价得分 6.00 分。绩效目标从绩效目标合理性、绩效目标的明确性和绩效目标的全面性三个方面进行评价。经评价,本项目绩效指标设置较为合理,但是项目数量指标未做细化,指标值无法体现具体实施内容,扣 3 分,该指标得 6.00 分。

表 5 绩效目标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标    | 标准分值 | 评价得分 | 得分率     |
|------|---------|------|------|---------|
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 绩效目标 | 绩效目标明确性 | 3.00 | 1.50 | 50.00%  |
| 绩效目标 | 绩效目标全面性 | 3.00 | 1.50 | 50.00%  |
| 合计   |         | 9.00 | 6.00 | 66.66%  |

(1) 绩效目标合理性,该指标分值 3.00 分,本次评价得 3.00 分,主要考核项目所设定的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价组查看了本项目的绩效目标表,本项目绩效目标设置基本合理,该指标得 3.00 分。

(2) 绩效目标的明确性,该指标分值 3.00 分,本次评价得 1.50 分,主要考核依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价组查看了本项目的绩效目标表,本项目绩效申报表数量指标不够细化,该指标综合扣 1.50 分,该指标得 1.50 分。

(3) 绩效目标的全面性,该指标分值 3.00 分,本次评价得 1.50 分,主要考核依据绩效目标设置的绩效指标是否全面有效的反映绩效目标实现情况。评价组查看了本项目的绩效目标表,数量指标未做细化,体现不出项目实施的主体内容,该指标综合扣 1.50 分,得 1.50 分。

### 3. 资金投入

该指标分值 6.00 分,本次评价得分 6.00 分。资金投入从预算编制科学性和资金分配合理性两个方面进行评价。经评价,本项目预算编制科学,资金分配合理。

表 6 资金投入得分情况表

| 二级指标 | 三级指标    | 标准分值 | 评价得分 | 得分率     |
|------|---------|------|------|---------|
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 合计   |         | 6.00 | 6.00 | 100.00% |

(1) 预算编制科学性,该指标分值 3.00 分,本次评价得 3.00 分,主要考核项目预算编制是否经过科学论证,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科

学性和合理性情况。本项目投资额编制经过科学论证且编制标准明确，该指标得 3.00 分。

(2) 资金分配合理性，该指标分值 3.00 分，本次评价得 3.00 分，主要考核项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性和合理性情况。本项目预算资金有测算依据，资金分配比较科学合理，该指标得 3.00 分。

## (二) 项目过程情况

项目过程指标主要包括资金管理和组织实施两方面内容，共细化为 7 个三级指标，权重分 17.00 分，本次评价得分 15.50 分，得分率为 91.18%，评分详细如下：

表 7 项目过程得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 标准分值  | 评价得分  | 得分率     |
|------|------|-------|-------|---------|
| 过程指标 | 资金管理 | 8.00  | 8.00  | 100.00% |
| 过程指标 | 组织实施 | 9.00  | 7.50  | 83.33%  |
| 合计   |      | 17.00 | 15.50 | 91.18%  |

### 1. 资金管理

该指标分值 8.00 分，本次评价得分 8.00 分。资金管理从资金到位率、到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、财务制度健全性、财务监控有效性六个方面进行评价。经评价，本项目财务制度健全，资金使用符合相关规定。具体评分如下：

表 8 资金管理得分情况表

| 二级指标 | 三级指标    | 标准分值 | 评价得分 | 得分率     |
|------|---------|------|------|---------|
| 资金管理 | 资金到位率   | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 资金管理 | 到位及时率   | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 资金管理 | 预算执行率   | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 合计   |         | 8.00 | 8.00 | 100.00% |

#### (1) 资金到位率

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目实际到位资金与计划应投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。经检查相关资料，本项目预算批复 100.00 万元，实际到位 100.00 万元，该指标得 2.00 分。

#### (2) 资金到位及时率

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目到位资金的及时性，用以反映和考核财政或项目主管部门对资金落实的及时性程度。经检查相关资料，本项目资金支付符合相关规定，该指标得 2.00 分。

#### (3) 预算执行率

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映项目预算执行情况。经检查相关资料，本项目预算与支出相符，该指标得 2.00 分。

#### (4) 资金使用合规性

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。经检查相关资料，本项目专项资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金的使用有完整的审批程序和相关资料，不存在截留、挪用、虚列支出等情况，该指标得 2.00 分。

## 2. 组织实施

该指标分值 9.00 分，本次评价得分 9.00 分。组织实施从管理制度健全性、制度执行有效性二个方面进行评价。经评价，本项目制定了相应的业务管理制度，且按计划高质量执行，得 9.00 分。

表 9 组织实施得分情况表

| 二级指标 | 三级指标    | 标准分值 | 评价得分 | 得分率     |
|------|---------|------|------|---------|
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 组织实施 | 项目质量可控性 | 3.00 | 1.50 | 50.00%  |
| 合计   |         | 9.00 | 7.50 | 83.33%  |

### (1) 管理制度健全性

该指标分值 3.00 分，本次评价得 3.00 分，主要考核项目制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对资金规范、项目安全运行的保障情况。经检查相关资料，本项目各项目管理

制度健全细化，该指标得 3.00 分。

## （2）制度执行有效性

该指标分值 3.00 分，本次评价得 3.00 分，主要考核项目单位是否为项目的安全、规范运行而采取了必要的管理、监控措施，用以反映和考核项目实施单位对项目实施的控制情况。经检查相关资料，已执行制定的相应制度和操作规范，该指标得 3.00 分。

## （4）项目质量可控性

该指标分值 3.00 分，本次评价得 1.50 分，主要考核项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。经检查相关资料和实地查看，项目单位未对该项目进行绩效目标跟踪监控，该指标综合扣 1.50 分，该指标得 1.50 分。

## （三）项目产出情况

项目产出指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四方面内容，共细化为 5 个三级指标，权重分 31.00 分，本次评价得分 28.00 分，得分率为 90.32%，评分详细如下：

表 10 项目产出得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 标准分值  | 评价得分  | 得分率     |
|------|------|-------|-------|---------|
| 产出指标 | 数量指标 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 产出指标 | 质量指标 | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| 产出指标 | 时效指标 | 3.00  | 0.00  | 00.00%  |
| 产出指标 | 成本指标 | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
| 合计   |      | 31.00 | 28.00 | 90.32%  |

### 1. 数量指标

表 11 质量指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标          | 标准分值  | 评价得分  | 得分率     |
|------|---------------|-------|-------|---------|
| 数量指标 | 山地苹果基地建设项目    | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
| 数量指标 | 带动贫困户人口发展山地苹果 | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
| 合计   |               | 10.00 | 10.00 | 100.00% |

该指标分值 10.00 分，本次评价得分 10.00 分。用以考核子洲县山地苹果基地建设项目资金的完成情况。经查看资料，本项目于 2022 年 11 月 30 日全部工程验收通过，该指标得 10.00 分。

### 2. 质量指标

表 12 质量指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标          | 标准分值  | 评价得分  | 得分率     |
|------|---------------|-------|-------|---------|
| 质量指标 | 新建山地苹果成活率     | 8.00  | 8.00  | 100.00% |
| 质量指标 | 山地苹果基地建设验收合格率 | 7.00  | 7.00  | 100.00% |
| 合计   |               | 15.00 | 15.00 | 100.00% |

#### (1) 新建山地苹果成活率

该指标分值 8.00 分，本次评价得分 8.00 分。本指标用以

反映和考核子洲县山地苹果基地建设项目的各项工程质量验收是否合格，是否符合规定的标准，经查看资料，本项目验收合格，该指标得 8.00 分。

#### (2) 山地苹果基地建设验收合格率

该指标分值 7.00 分，本次评价得分 7.00 分。本指标用以考核山地苹果基地建设验收合格率是否符合验收标准，经查看资料，本项复合验收的相关规定的标准，该指标得 7.00 分。

### 3. 时效指标

该指标分值 3.00 分，本次评价得分 0.00 分。本指标主要考核项目单位是否能按计划和要求完成任务。经检查相关资料，本项目 2022 年 10 月 31 日组织项目完工自评，扣 3.00 分，得 0.00 分。

### 4. 成本指标

该指标分值 3.00 分，本次评价得分 3.00 分。本指标用以反映和考核项目支出是否控制在预算金额范围内。经检查相关资料，本项目预算与支出相符，该指标得 3.00 分。

#### (四) 项目效益情况

项目效益包括项目所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和受益对象满意度五个方面。共细化为 6 个三级指标，权重分 29.00 分，本次评价得分 29.00 分，得分率为 100.00%，评分详细如下：

表 13 项目效益得分情况表



| 一级指标 | 二级指标    | 标准分值  | 评价得分  | 得分率     |
|------|---------|-------|-------|---------|
| 效益指标 | 经济效益    | 4.00  | 4.00  | 100.00% |
| 效益指标 | 社会效益    | 4.00  | 4.00  | 100.00% |
| 效益指标 | 可持续影响   | 6.00  | 6.00  | 100.00% |
| 效益指标 | 生态效益    | 7.00  | 7.00  | 100.00% |
| 效益指标 | 受益对象满意度 | 8.00  | 8.00  | 100.00% |
| 合计   |         | 29.00 | 29.00 | 100.00% |

### 1. 经济效益

该指标分值 4.00 分，本次评价得分 4.00 分。本指标考核项目建成后，是否可提高果农及周边乡、镇广大农民生产生活条件。项目组经问卷调查及实地走访，相关工程周边农户对工程实施后的影响效果认可度比较高，得 4.00 分。

### 2. 社会效益

该指标分值 4.00 分，本次评价得分 4.00 分。社会效益通过下达子洲县山地苹果基地建设项目建设资金，是否提供周边劳动就业岗位。通过实地调查和村民调查问卷分析，项目周边农户认可项目实施，项目实施中为周边乡镇提供较多就业岗位，得 4.00 分。

### 3. 可持续影响

该指标分值 7.00 分，本次评价得分 7.00 分。可持续影响从子洲县山地苹果基地建设项目资金下达后，是否可带动区域和合作社生态人居环境，是否履行子洲县山地苹果基地建设项

目支出专项资金使用的全过程监管。经检查相关资料，通过实地调查和村民调查问卷分析，项目实施后周边人民群众的生活条件得到改善，该指标得 7.00 分。

#### **4. 受益对象满意度**

该指标分值 8.00 分，本次评价得分 8.00 分。通过向服务对象发放满意度调查问卷，经过对问卷结果的统计，服务对象对本项目的满意度在 95%以上，该指标得 8.00 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）主要经验及做法**

2022 年农业农村局子洲县山地苹果基地建设项目以科学发展观为指导，以现代科技为支撑，以市场为导向，以促进农民持续增收为目标，按照“山地建园、集中连片、高点起步、打造品牌”的思路，大力推行“区域化布局、规模化建园、科学化管理、标准化生产”的发展模式，全面提升苹果产业现代化水平，促进我县苹果产业又好又快发展。

#### **（二）存在的问题**

##### **1. 绩效评价意识薄弱，自评报告质量不高**

项目主管单位相关人员对绩效编制的观念和认识尚不到位，不熟悉绩效编制内容。具体而言，在绩效目标设置方面不够规范，数量指标设置不够清晰。

##### **2. 项目未按时完工，项目管理水平有待提高**

本项目制度建设健全，但是在实际实施过程中，存在奖补

资金发放不及时等问题。

## 六、有关建议

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）、《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发〔2019〕73号）、《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发〔2020〕11号）、《子洲县财政支出事前绩效评估管理办法》（子财发〔2022〕204号）等文件精神。为优化财政资源配置、提升公共产品和公共服务水平，将事前绩效目标编制、事前绩效评估、绩效监控、绩效自价等绩效管理理念和管理方法贯穿于项目工作的全过程。建议子洲县农业农村局做到以下工作要求：

1、每一个项目从设立开始要编制《绩效目标表》；

2、每个项目设立后要依据立项的必要性、投入的经济性、目标的合理性、实施方案的有效性、筹资的合规性五个方面开展事前绩效评估；

3、按照项目文件的要求做好每个项目绩效目标运行跟踪监控，实时发现、分析和解决项目实施过程中遇到的各种问题，保障预算执行进度和事项完成进度，提高民生实事工作任务完成效率，及时做好项目的考核验收；

## 七、其他需要说明的问题

本次评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资料具有真实性和可靠性,数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

附件 1:

1. 2022 年子洲县山地苹果基地建设项目绩效评价体系及得分表

附件 1:

| 2022 年山地苹果基地建设项目资金绩效评价体系及得分表 |              |                 |         |    |                                                    |                                                                                                                                                                                   |      |                 |
|------------------------------|--------------|-----------------|---------|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 序号                           | 一级指标         | 二级指标            | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                               | 评分标准                                                                                                                                                                              | 得分   | 扣分依据            |
| 1                            | 决策<br>(23 分) | 项目立项<br>(8 分)   | 立项依据充分性 | 4  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点:<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1.00 分);<br>②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (1.00 分);<br>③项目是否属于山地苹果项目支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 (1.00 分);<br>④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 (1.00 分)。 | 4.00 |                 |
| 2                            |              |                 | 项目立项规范性 | 4  | 项目的申请,设立过程是否符合相关要求,用以考核项目立项的规范情况。                  | 评价要点:<br>①项目是否按照规定的程序申请设立 (2.00 分);<br>②所提交的文件、材料是否符合相关要求 (1.00 分);<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等 (1.00 分)。                                                                 | 4.00 |                 |
| 3                            |              | 绩效目标<br>管理(9 分) | 绩效目标合理性 | 3  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点:<br>①项目是否设置了绩效目标 (1.00 分);<br>②绩效目标是否与山地苹果基地建设项目有相关性 (1.00 分);<br>③项目预期产出效益和效果是否不低于立项文件要求的最低要求 (1.00 分)。<br>注:若①不满足得分标准,则该项指标得 0 分。                                          | 3.00 |                 |
| 4                            |              |                 | 绩效指标明确性 | 3  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 评价要点:<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,且与目标任务数数符合 (1.50 分);<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1.50 分)。                                                                                             | 1.50 | 绩效目标申报表数量指标未做细化 |

|    |         |          |         |      |                                                              |                                                                                                                         |      |                 |
|----|---------|----------|---------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 5  |         |          | 绩效指标全面性 | 3    | 依据绩效目标设置的绩效指标是否全面有效的反映绩效目标实现情况。                              | 评价要点：<br>①绩效指标是否全面、有效地反映绩效目标（1.50分）；<br>②绩效指标设置是否存在避重就轻或指标值不合理的情况（1.50分）。                                               | 1.50 | 绩效目标申报表数量指标未做细化 |
| 6  |         | 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | 3    | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证（1.00分）；<br>②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1.00分）；<br>③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1.00分）。                   | 3.00 |                 |
| 7  |         |          | 资金分配合理性 | 3    | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。        | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分（1.50分）；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.50分）。                                                   | 3.00 |                 |
| 8  | 过程（17分） | 资金管理（8分） | 资金到位率   | 2.00 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 评价要点：<br>①资金到位率100分，且按规定时间及时到位，得2分；<br>②其他情况，在按满分乘以到位率计算得分的基础上，综合考虑未全额到位、未及时到位的原因等因素核定最后得分。                             | 2.00 |                 |
| 9  |         |          | 到位及时率   | 2.00 | 是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度。                                      | 评价要点：<br>资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。<br>①到位及时率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分为：指标分值×到位及时率；<br>②到位及时率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分为0。 | 2.00 |                 |
| 10 |         |          | 预算执行率   | 2.00 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                              | 评价要点：<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>=100%得2.00分，未达到100%的按比例得分，超过100%的，每超过10个百分点，扣0.01分，扣完为止。                        | 2.00 |                 |

|    |                       |                   |                           |      |                                                                 |                                                                                                                                                            |      |                    |
|----|-----------------------|-------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 11 |                       | 组织实<br>施(9<br>分)  | 资金使用<br>合规性               | 2.00 | 项目资金使用是否符合相关的<br>财务管理制度规定,用以反映和<br>考核项目资金的规范运行情况。               | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有<br>关专项资金管理办法的规定(0.50分);<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.50<br>分);<br>③是否符合项目预算批复规定的用途(0.50分);<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况<br>(0.50分)。 | 2.00 |                    |
| 12 |                       |                   | 管理制度<br>健全性               | 3.00 | 项目实施单位的财务和业务管<br>理制度是否健全,用以反映和考<br>核财务和业务管理制度对项目<br>顺利实施的保障情况。  | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度<br>(1.00分);<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1.00<br>分)。<br>③项目绩效自评组织情况(1.00分)。                                                      | 3.00 |                    |
| 13 |                       |                   | 制度执行<br>有效性               | 3.00 | 项目实施是否符合相关业务管<br>理制度规定,用以考核业务管理<br>制度的有效执行情况。                   | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定(1.00<br>分);<br>②项目调整及支出调整手续是否完备(1.00分);<br>③项目合同书、验收报告、政府采购等资料是否齐<br>全并及时归档(1.00分)。                                            | 3.00 |                    |
| 14 |                       |                   | 项目质量<br>可控性               | 3.00 | 项目实施单位是否为达到项目<br>质量要求而采取了必需的措施,<br>用以反映和考核项目实施单位<br>对项目质量的控制情况。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准<br>(1.50分);<br>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的<br>控制措施或手段(1.50分)。                                                                    | 1.50 | 单位未对项目进行绩效<br>跟踪监控 |
| 15 | 项目<br>产出<br>(31<br>分) | 数量指<br>标(10<br>分) | 山地苹果<br>基地建设<br>项目        | 5.00 | 用以考核山地苹果基地建设项<br>目任务的完成情况。                                      | 评价要点:<br>评价组获取项目实施计划、项目文件、项目验收书,<br>抽取部分样本进行现场查看,将实际完成的山地苹<br>果标准园创建面积与项目文件的面积进行对比,计<br>算山地苹果基地建设项目任务完成情况。                                                 | 5.00 |                    |
| 16 |                       |                   | 带动贫困<br>户人口发<br>展山地苹<br>果 | 5.00 | 用以考核山地苹果基地建设带<br>动贫困户发展山地苹果任务的<br>完成情况。                         | 评价要点:<br>评价组获取项目实施计划、项目文件、子洲县果树<br>产业带贫户花名表,将实际带贫人数与绩效目标进<br>行对比,计算带贫人数任务完成情况。<br>带贫人数任务完成比例=实际带贫人数/绩效目标<br>的带贫人数。<br>根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。                 | 5.00 |                    |

|    |           |           |               |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |             |
|----|-----------|-----------|---------------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 17 |           | 质量指标(15分) | 新建山地苹果成活率     | 8.00 | 用以考核新建山地苹果成活的情况。                          | 评价要点：<br>评价组获取项目实施计划、项目文件、项目验收书，并抽取部分样本进行现场查看，果苗成活率在85%以上得满分，每降低一个百分点，扣0.01分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                     | 8.00 |             |
| 19 |           |           | 山地苹果基地建设验收合格率 | 7.00 | 用以考核山地苹果基地建设项目是否复核验收标准。                   | 评价要点：<br>评价组获取项目实施计划、项目文件、项目验收书，并抽取部分样本进行现场查看，山地苹果基地建设项目验收合格率达到100%的得满分，每降低一个百分点，扣0.01.00分，扣完为止。                                                                                                                                                                                       | 7.00 |             |
| 20 |           | 时效指标(3分)  | 任务完成及时性       | 3.00 | 用以考核项目建设任务按计划批复规定时间完成情况。                  | 评价要点：<br>按照实施方案或者项目立项文件，是否能按计划和要求完成任务。全部完成得满分，未全部完成按照完成程度百分比得分，未完成不得分。                                                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 项目未在规定时间内完工 |
| 21 |           | 成本指标(3分)  | 投入标准          | 3.00 | 用以考核新建山地苹果基地建设项目以及品种改良和标准园以奖代补是否满足相关文件要求。 | 评价要点：<br>①以立项文件中标准园创建的补助标准为依据，实际补助金额与文件规定的补助标准一致的得1.00分；实际补助金额偏离标准金额的，每偏离10个百分点扣0.1.00分，扣完为止(1.00分)。<br>②以立项文件中新建山地苹果基地的补助标准为依据，实际补助金额与文件规定的补助标准一致的得1.00分；实际补助金额偏离标准金额的，每偏离10个百分点扣0.1.00分，扣完为止(1.00分)。<br>③其他补助项目以项目立项文件中财政资金为标准，实际支出低于等于预算金额得满分；超过预算金额的，每超过1个百分点扣0.1.00分，扣完为止(1.00分)。 | 3.00 |             |
| 22 | 项目效益(30分) | 经济效益(4分)  | 带动果农增收        | 4.00 | 用以考核项目建设后，带动果农增收的情况。                      | 评价要点：<br>通过走访和问卷调查，现场访谈并实地查看山地苹果的售价。认为山地苹果项目提升了年收入的果农比例达受访者总数的90%以上得5分，80%-90%得4分，70%-80%得3分，60%-70%得2.00分，低于60%不得分。<br>若建设任务未完成，则按照完成的比例乘以问卷得分。                                                                                                                                       | 4.00 |             |



|    |  |             |                |        |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |  |
|----|--|-------------|----------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 23 |  | 社会效益(4分)    | 新增就业岗位         | 4.00   | 通过项目的实施,是否为地区农村劳动力提供更多的就业机会。       | 评价要点:<br>通过项目实施,是否提供了更多的就业岗位,若建设任务未完成,则按照完成的比例乘以基础分值得分。                                                                                                                                 | 4.00  |  |
| 24 |  | 生态效益(6分)    | 保护生态环境         | 6.00   | 通过项目的实施,山地果树是否可以,固定水土、防风固沙、保护生态环境。 | 评价要点:<br>通过实地走访,检查山地苹果基地建设是否充分利用退耕荒坡荒地,起到防止水土流失,从而保护生态环境。<br>若建设任务未完成,则按照完成的比例乘以基础分值得分。                                                                                                 | 6.00  |  |
| 25 |  | 可持续影响(7分)   | 改善村民生活条件       | 7.00   | 人民群众群众的生活条件得到改善                    | 评价要点:<br>通过村民调查问卷分析,认为山地苹果项目改善村民生活条件的村民达受访群众比例在 90%(含 90%)以上的得 7.00 分,比例在 80%以上不足 90%得 5.00 分,比例在 70%以上不足 80%得 3.00 分,比例在 60%以上不足 70%得 1.00 分,比例不足 60%的不得分。<br>若建设任务未完成,则按照完成的比例乘以问卷得分。 | 7.00  |  |
| 26 |  | 受益对象满意度(8分) | 农业经营主体满意度(4分)  | 4.00   | 项目建设后,农业经营主体对项目建设的满意程度。            | 评价要点:<br>通过走访或问卷调查,了解农业经营主体对山地苹果基地建设项目的总体满意程度。当调查满意的单位占调查单位总数的比值超过 90%时得 4 分,其余根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。                                                                                     | 4.00  |  |
| 27 |  |             | 项目涉及地群众满意度(4分) | 4.00   | 项目建设后,项目涉及地群众对项目建设的满意程度。           | 评价要点:<br>通过走访或问卷调查,分析项目涉及地群众对山地苹果基地建设项目的总体满意程度。调查人员为项目区成年人。当调查满意的人数占调查总人数的比值超过 90%时得 4 分,其余根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。                                                                         | 4.00  |  |
| 合计 |  | 100.00      | 100.00         | 100.00 |                                    |                                                                                                                                                                                         | 92.50 |  |
